



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CI – SEINFRA Nº 478/2022	DATA: 29/07/2022
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: JOSELITO GOMES – PREFEITO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP BM Nº 006/2022.	
<p>Prezado Senhor,</p> <p>Encaminhamos a V. S^a o boletim de medição Nº 006/2022 para pagamento à Empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 02.951.249/0001-08, ganhadora do Processo Licitatório nº 061/2021, Contrato nº 089/2021, cujo objeto é de Contratação de empresa especializada para executar dos serviços de construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, período de medição de 01/07/2022 à 30/07/2022, no valor da medição R\$ 86.454,92 (oitenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p> RICARDO MALTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO</p>	


Flávia Souza
Matrícula: 2994
Gabinete do Prefeito
29/07/22



RIO BRANCO Construtora

RECIBO

Valor Bruto R\$ 86.454,92
INSS R\$ 3.804,02
ISS R\$ 2.593,65
IR R\$ 1.296,82
Líquido a receber R\$ 77.760,43

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância supra de R\$ 86.454,92 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal N° 472, relativo a 6ª Medição do Contrato N° 089/2021, referente a dos serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social – CREAS, localizado na rua Joaquim Souto, no município de Gravatá/PE, conforme proposta vencedora da tomada de preço 004/2021 - processo licitatório n° 061/2021, pelo qual damos a mais plena e geral quitação.

Segue abaixo os dados de nossa conta corrente para crédito do referido pagamento:

- ✓ BANCO BRADESCO AG - 2518 C/C – 22192-9 – Rio Branco Construtora Ltda.
- ✓ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG – 3018 / OP.003 / C/C – 1702-8

Recife/PE, 29 de julho de 2022.

RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 02.951.249/0001-08
Luiz Américo de Miranda Júnior
Diretor / Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE
RG: 2.480.099 SSP/PE
CPF: 415.893.514-87

Praça Arsenal da Marinha, 35 Sl. 403 – Recife Antigo Recife PE CEP50030-360
CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com
Fone/Fax: 81 3034-0010



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000472

Data e Hora de Emissão

29/07/2022 10:19:55

Código de Verificação

1AFL-DV1Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.951.249/0001-08

Inscrição Municipal: 406.616-2

Nome/Razão Social: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Endereço: RUA MIN NELSON HUNGRIA 63, SALA 0402 EDF NELSON HUNGRIA C - BOA VIAGEM - CEP: 51020-100

Município: Recife

UF: PE

E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GRAVATA

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Cleto Caripelo - Centro - CEP: 65641-000

Município: Gravata

UF: PE

E-mail: licitacao.gravata@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 089/2021, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SOUTO, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021.

ART: PE20220743650

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%

RETENÇÕES:

ISS: R\$ 2.593,65

IR: R\$ 1.296,82

INSS: R\$ 3.804,02

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO: AG 2 2518 / C/C 2 22192-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG 2 3018 / OP.003 / C/C 2 1702-8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.804,02	R\$ 1.296,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 86.454,92

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
34.681,97	0,00	51.872,96	5,00%	2.593,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Gravata - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: CO002/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20220743650

Eng. Civil
CREA 1819847080



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006
 Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INICIO: 01/07/2022
 DATA DE TERMINO: 30/07/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2022

Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Valor Acumulado Medido: R\$ 556.586,98
 Saldo do Contrato: R\$ 20.314,69
 Valor da Empresa: VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 576.901,67
 VALOR JA REALIZADO: R\$ 470.132,08
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 58.454,92
 VALOR ACUMULADO: R\$ 656.656,98
 PERCENTUAL REALIZADO: 99,48%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 20.314,69

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI ANTERIOR (R\$)	(G) ESTA MEDIÇÃO QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(D) ACUMULADO ATUAL QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	(E) SALDO CONTRATUAL TOTAL COM BDI (R\$)
1.1	SINAPI	9077	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	R\$ 144,87	128,00	R\$ 14.703,98	118,00	R\$ 13.324,82	10,00	R\$ 14.808,80	124,00	R\$ 14.243,88	R\$ 459,49
1.2	SINAPI	4613	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22 ADESVADA DE 2,0 X 1,125 M	M2	R\$ 254,61	9,00	R\$ 2.291,49	9,00	R\$ 2.291,49	0,00	R\$ 2.291,49	9,00	R\$ 2.291,49	R\$ 0,00
1.3	SINAPI	98524	LANÇADORA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ERVADEIRA AF. 02/2018	M2	R\$ 3,00	450,00	R\$ 1.377,00	450,00	R\$ 1.377,00	0,00	R\$ 1.377,00	450,00	R\$ 1.377,00	R\$ 0,00
1.4	SINAPI	88458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF. 05/2018	M2	R\$ 89,16	31,50	R\$ 2.808,23	31,50	R\$ 2.808,23	0,00	R\$ 2.808,23	31,50	R\$ 2.808,23	R\$ 0,00
1.5	SINAPI	90059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF. 10/2016	M	R\$ 47,13	66,90	R\$ 3.153,00	66,90	R\$ 3.153,00	0,00	R\$ 3.153,00	66,90	R\$ 3.153,00	R\$ 0,00
1.6	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	R\$ 707,73	9,00	R\$ 4.246,38	9,00	R\$ 4.246,38	0,00	R\$ 4.246,38	9,00	R\$ 4.246,38	R\$ 0,00
1.7	SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 P	UND	R\$ 1.761,25	1,00	R\$ 1.761,25	1,00	R\$ 1.761,25	0,00	R\$ 1.761,25	1,00	R\$ 1.761,25	R\$ 0,00
2.1	SINAPI	96522	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 09/2017	M3	R\$ 136,89	91,00	R\$ 11.086,06	86,73	R\$ 9.546,34	4,27	R\$ 11.176,31	86,53	R\$ 11.023,75	R\$ 64,34
3.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 8 CM. AF. 09/2017	M3	R\$ 26,86	1,10	R\$ 29,58	1,10	R\$ 29,58	0,00	R\$ 29,58	1,10	R\$ 29,58	R\$ 0,00
3.2	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SIMILARES. AF. 09/2020	M2	R\$ 113,28	84,49	R\$ 9.571,03	84,49	R\$ 9.571,03	0,00	R\$ 9.571,03	84,49	R\$ 9.571,03	R\$ 0,00
3.3	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E SIMILARES. AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	39,30	R\$ 4.992,70	39,30	R\$ 4.992,70	0,00	R\$ 4.992,70	39,30	R\$ 4.992,70	R\$ 0,00
3.4	SINAPI	96546	ARRUMADO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	R\$ 16,41	753,92	R\$ 12.371,83	753,92	R\$ 12.371,83	0,00	R\$ 12.371,83	753,92	R\$ 12.371,83	R\$ 0,00
3.5	SINAPI	92776	ARRUMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBROLDADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 17/2015	KG	R\$ 16,33	186,13	R\$ 3.072,16	186,13	R\$ 3.072,16	0,00	R\$ 3.072,16	186,13	R\$ 3.072,16	R\$ 0,00
3.6	SINAPI	92759	ARRUMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBROLDADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 17,61	166,90	R\$ 2.972,49	166,90	R\$ 2.972,49	0,00	R\$ 2.972,49	166,90	R\$ 2.972,49	R\$ 0,00
3.7	SINAPI	92715	CONTEINER DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,53 M - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	R\$ 549,35	8,59	R\$ 4.713,42	8,59	R\$ 4.713,42	0,00	R\$ 4.713,42	8,59	R\$ 4.713,42	R\$ 0,00
3.8	SINAPI	92724	CONTEINER DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PRENSADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	R\$ 377,99	6,34	R\$ 2.395,82	6,34	R\$ 2.395,82	0,00	R\$ 2.395,82	6,34	R\$ 2.395,82	R\$ 0,00
4.1	SINAPI	92289	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E SIMILARES. AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	205,29	R\$ 28.207,96	205,29	R\$ 28.207,96	0,00	R\$ 28.207,96	205,29	R\$ 28.207,96	R\$ 0,00

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.07.29 09:33:58 -03'00"
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Eng. Civil
 CREA 1819847080



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006

DATA DE NICO: 01/07/2022
 DATA DE TÉRMINO: 30/07/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor Acumulado Medido: R\$ 556.586,98
 Saldo do Contrato: R\$ 20.314,69
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

Esta Medição: R\$ 86.454,92

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO: R\$ 576.901,67
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 470.132,08
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 86.454,92
 VALOR ACUMULADO: R\$ 556.586,98
 PERCENTUAL REALIZADO: 96,46%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 20.314,69

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)		
4.2	SINAPI	92775	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R\$ 16,83	1057,40	R\$ 17.267,34	1057,40	R\$ 17.267,34	0,00	R\$ 0,00	1057,40	R\$ 17.267,34	0,00	R\$ 0,00
4.3	SINAPI	92759	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R\$ 17,81	348,74	R\$ 6.211,06	348,74	R\$ 6.211,06	0,00	R\$ 0,00	348,74	R\$ 6.211,06	0,00	R\$ 0,00
4.4	SINAPI	92715	CONCRETAGEM DE PILARES, COLUNAS, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	R\$ 549,35	5,77	R\$ 3.169,75	5,77	R\$ 3.169,75	0,00	R\$ 0,00	5,77	R\$ 3.169,75	0,00	R\$ 0,00
4.5	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, ESCALAS, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA ENFERMAGEM, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	R\$ 377,89	9,93	R\$ 3.714,86	9,93	R\$ 3.714,86	0,00	R\$ 0,00	9,93	R\$ 3.714,86	0,00	R\$ 0,00
4.6	SINAPI	101983	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (8+9). AF_11/2020	M2	R\$ 148,67	229,21	R\$ 34.076,85	229,21	R\$ 34.076,85	0,00	R\$ 0,00	229,21	R\$ 34.076,85	0,00	R\$ 0,00
4.7	SINAPI	101984	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+9). AF_11/2020	M2	R\$ 139,55	220,91	R\$ 30.697,08	220,91	R\$ 30.697,08	0,00	R\$ 0,00	220,91	R\$ 30.697,08	0,00	R\$ 0,00
4.8	SINAPI	06557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2,00 CM DE ESPESURA, EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, PARA PISO EM VIGA. AF_07/2014	M2	R\$ 31,71	84,49	R\$ 2.679,19	84,49	R\$ 2.679,19	0,00	R\$ 0,00	84,49	R\$ 2.679,19	0,00	R\$ 0,00
5.1	SINAPI	87882	PREPARO PISO EM ARGAMASSA TRACO 1X (CIMENTO E AREIA), NÃO ADEMO, ESPESURA 5CM. AF_07/2014	M2	R\$ 47,57	190,31	R\$ 9.053,05	190,31	R\$ 9.053,05	0,00	R\$ 0,00	190,31	R\$ 9.053,05	0,00	R\$ 0,00
5.2	SINAPI	93183	VENGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, CIMENTO. AF_08/2014	M	R\$ 50,09	32,40	R\$ 1.622,92	32,40	R\$ 1.622,92	0,00	R\$ 0,00	32,40	R\$ 1.622,92	0,00	R\$ 0,00
5.3	SINAPI	93195	VENGA PRÉ-MOLDADA PARA VAGOS DE MAIS DE 1,5 M DE VÃO, CIMENTO. AF_08/2014	M	R\$ 45,35	32,40	R\$ 1.469,34	32,40	R\$ 1.469,34	0,00	R\$ 0,00	32,40	R\$ 1.469,34	0,00	R\$ 0,00
5.4	SINAPI	93185	VENGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_05/2016	M	R\$ 49,37	22,20	R\$ 1.098,01	22,20	R\$ 1.098,01	0,00	R\$ 0,00	22,20	R\$ 1.098,01	0,00	R\$ 0,00
5.5	SINAPI	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R\$ 90,49	499,77	R\$ 45.219,19	499,77	R\$ 45.219,19	0,00	R\$ 0,00	499,77	R\$ 45.219,19	0,00	R\$ 0,00
6.1	SINAPI	87878	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/20	M2	R\$ 4,08	869,30	R\$ 3.517,16	869,30	R\$ 3.517,16	0,00	R\$ 0,00	869,30	R\$ 3.517,16	0,00	R\$ 0,00
6.2	SINAPI	87715	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁRQUIS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$ 51,54	869,30	R\$ 44.949,10	869,30	R\$ 44.949,10	0,00	R\$ 0,00	869,30	R\$ 44.949,10	0,00	R\$ 0,00
6.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALVADEADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	R\$ 44,14	190,31	R\$ 8.400,26	190,31	R\$ 8.400,26	0,00	R\$ 0,00	190,31	R\$ 8.400,26	0,00	R\$ 0,00

Luiz Américo de Miranda
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 JUNIOR:41589351487-031007
 JUNIOR:41589351487-031007



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006

DATA DE NÍCIO: 01/07/2022
 DATA DE TÉRMINO: 30/07/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA ERELLI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor Acumulado Medido: R\$ 558.586,98
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

QUADRO RESUMO


VALOR CONTRATO:	R\$ 576.901,67
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 470.132,08
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 88.454,92
VALOR ACUMULADO:	R\$ 558.586,98
PERCENTUAL REALIZADO:	96,46%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 20.314,69

Processo Licitatório: 061/2021
 Contrato: 086/2021
 BDH: 24,20%
 Prazo de execução: 02 (dois) meses

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PLANOILHA CONTRATUAL (B) ACUMULADO ANTERIOR			PLANOILHA DE MEDIÇÃO (C) ESTA MEDIÇÃO			PLANOILHA DE MEDIÇÃO (D) ACUMULADO ATUAL			PLANOILHA DE MEDIÇÃO (E) SALDO CONTRATUAL		
						QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
8.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6 M² NA ALTURA INTERMEDIAS PAREDES. AF_ 09/2014	M2	R\$ 81,39	132,38	R\$ 8.126,81	R\$ 8.126,81	132,38	R\$ 8.126,81	R\$ 8.126,81	132,38	R\$ 8.126,81	R\$ 8.126,81	132,38	R\$ 8.126,81	R\$ 0,00
8.5	ORSE	7323	PIBÓ TÁTIL DIRECIONAL BOU ALERTA, EM BORRACHA, PNEUMÁTICO VISUAL, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUINDO REGULAGEM DE BASE	M	R\$ 404,82	12,50	R\$ 5.060,25	-	12,50	R\$ 5.060,25	R\$ 5.060,25	12,50	R\$ 5.060,25	R\$ 5.060,25	12,50	R\$ 5.060,25	R\$ 0,00
7.1	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 12/2018	M2	R\$ 15,70	151,79	R\$ 2.383,10	R\$ 2.383,10	151,79	R\$ 2.383,10	R\$ 2.383,10	151,79	R\$ 2.383,10	R\$ 2.383,10	151,79	R\$ 2.383,10	R\$ 0,00
7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 CM DE ONDA PARA ONDA, TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTADO. AF_ 07/2019	M2	R\$ 60,66	151,79	R\$ 9.237,84	R\$ 9.237,84	151,79	R\$ 9.237,84	R\$ 9.237,84	151,79	R\$ 9.237,84	R\$ 9.237,84	151,79	R\$ 9.237,84	R\$ 0,00
7.3	SINAPI	98109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_ 07/2019	M2	R\$ 37,56	190,31	R\$ 7.146,04	-	190,31	R\$ 7.146,04	R\$ 7.146,04	190,31	R\$ 7.146,04	R\$ 7.146,04	190,31	R\$ 7.146,04	R\$ 0,00
7.4	SINAPI	100327	FURO E TERMOINTERNO EM CHAPÉU DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 2#, CORTE DE 3 CM, INCLUSIVE CIMENTADO. AF_ 07/2019	M	R\$ 54,25	65,00	R\$ 3.526,25	R\$ 3.526,25	65,00	R\$ 3.526,25	R\$ 3.526,25	65,00	R\$ 3.526,25	R\$ 3.526,25	65,00	R\$ 3.526,25	R\$ 0,00
8.1	SINAPI	90786	ALUMÍNIO DE PORTA-FRONTAL DE MADEIRA EM ACABAMENTO METÁLICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO BRANCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2018	UND	R\$ 489,50	12,00	R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00	12,00	R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00	12,00	R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00	12,00	R\$ 5.874,00	R\$ 0,00
8.2	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA E DOBRANÇAS. AF_ 12/2019	UND	R\$ 583,60	2,00	R\$ 1.167,20	R\$ 1.167,20	2,00	R\$ 1.167,20	R\$ 1.167,20	2,00	R\$ 1.167,20	R\$ 1.167,20	2,00	R\$ 1.167,20	R\$ 0,00
8.3	SINAPI	91336	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2018	M2	R\$ 744,32	3,24	R\$ 2.411,80	R\$ 2.411,80	3,24	R\$ 2.411,80	R\$ 2.411,80	3,24	R\$ 2.411,80	R\$ 2.411,80	3,24	R\$ 2.411,80	R\$ 0,00
8.4	SINAPI	90930	FECHEADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UND	R\$ 154,19	14,00	R\$ 2.158,66	R\$ 2.158,66	14,00	R\$ 2.158,66	R\$ 2.158,66	14,00	R\$ 2.158,66	R\$ 2.158,66	14,00	R\$ 2.158,66	R\$ 0,00
8.5	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90x210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2021	UND	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 0,00
8.6	COMPOSIÇÃO	1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 125x210 CM, ESPESURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	UND	R\$ 2.895,95	1,00	R\$ 2.895,95	R\$ 2.895,95	1,00	R\$ 2.895,95	R\$ 2.895,95	1,00	R\$ 2.895,95	R\$ 2.895,95	1,00	R\$ 2.895,95	R\$ 0,00
8.7	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	R\$ 623,00	23,17	R\$ 14.434,91	R\$ 14.434,91	23,17	R\$ 14.434,91	R\$ 14.434,91	23,17	R\$ 14.434,91	R\$ 14.434,91	23,17	R\$ 14.434,91	R\$ 0,00
8.8	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	R\$ 317,14	4,44	R\$ 1.408,10	-	4,44	R\$ 1.408,10	R\$ 1.408,10	4,44	R\$ 1.408,10	R\$ 1.408,10	4,44	R\$ 1.408,10	R\$ 0,00

Amir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR-R41589351487
 Data: 2022.07.29 09:22:633
 -03'00"



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006
 DATA DE INICIO: 01/07/2022
 DATA DE TÉRMINO: 30/07/2022
 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/07/2022

Empres: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Esta Medição: Valor Acumulado Medido: R\$ 576.901,67
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Valor da Empresa: R\$ 576.901,67

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 576.901,67
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 470.132,06
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 86.454,92
 VALOR ACUMULADO: R\$ 866.686,98
 PERCENTUAL REALIZADO: 96,45%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 20.314,69

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL
					QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	
8.9	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LÍBRO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021. P	M2	R\$ 207,98	23,17	R\$ 4.819,13	23,17	R\$ 4.819,13	23,17	R\$ 4.819,13	0,00	R\$ 0,00
9.1	SINAPI	69485	APLICAÇÃO DE FUNDO RELAZADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 09/2014	M2	R\$ 2,35	859,84	R\$ 2.013,57	859,84	859,84	859,84	R\$ 2.013,57	0,00	R\$ 0,00
9.2	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	M2	R\$ 22,64	365,20	R\$ 8.268,13	365,20	365,20	365,20	R\$ 8.268,13	0,00	R\$ 0,00
9.3	SINAPI	98497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2014	M2	R\$ 12,83	491,64	R\$ 6.307,74	491,64	491,64	491,64	R\$ 6.307,74	0,00	R\$ 0,00
9.4	SINAPI	98489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	M2	R\$ 13,87	859,84	R\$ 11.864,37	859,84	859,84	859,84	R\$ 11.864,37	0,00	R\$ 0,00
9.5	SINAPI	69494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 09/2014	M2	R\$ 18,11	190,31	R\$ 3.446,51	190,31	190,31	190,31	R\$ 3.446,51	0,00	R\$ 0,00
9.6	SINAPI	68489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2014	M2	R\$ 15,70	190,31	R\$ 2.987,87	190,31	190,31	190,31	R\$ 2.987,87	0,00	R\$ 0,00
10.1	SINAPI	91064	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (T), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 14,21	30,00	R\$ 426,30	30,00	30,00	30,00	R\$ 426,30	0,00	R\$ 0,00
10.2	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 5,28	500,00	R\$ 2.640,00	500,00	500,00	500,00	R\$ 2.640,00	0,00	R\$ 0,00
10.3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 10,02	150,00	R\$ 1.503,00	150,00	150,00	150,00	R\$ 1.503,00	0,00	R\$ 0,00
10.4	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10x250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2019	UND	R\$ 169,87	55,00	R\$ 9.343,15	55,00	55,00	55,00	R\$ 9.343,15	0,00	R\$ 0,00
10.5	SINAPI	93143	CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2019	UND	R\$ 171,68	7,00	R\$ 1.201,76	7,00	7,00	7,00	R\$ 1.201,76	0,00	R\$ 0,00
10.6	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA).	UND	R\$ 137,17	24,00	R\$ 3.292,08	24,00	24,00	24,00	R\$ 3.292,08	0,00	R\$ 0,00
10.7	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 10,49	11,00	R\$ 115,28	11,00	11,00	11,00	R\$ 115,28	0,00	R\$ 0,00
10.8	SINAPI	93954	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	1,00	1,00	1,00	R\$ 11,02	0,00	R\$ 0,00
10.9	SINAPI	93955	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	1,00	1,00	R\$ 12,07	0,00	R\$ 0,00
10.10	SINAPI	93956	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	1,00	1,00	R\$ 12,07	0,00	R\$ 0,00
10.11	SINAPI	97962	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE BOBREPOR, COM 11 LÂMPADA LED DE 12x13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 41,92	25,00	R\$ 1.048,00	25,00	25,00	25,00	R\$ 1.048,00	0,00	R\$ 0,00
10.12	SINAPI	101591	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMF, 0,8/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	R\$ 18,75	96,00	R\$ 1.808,00	96,00	96,00	96,00	R\$ 1.808,00	0,00	R\$ 0,00
10.13	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE BOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	1,00	1,00	1,00	R\$ 125,95	0,00	R\$ 0,00

Amir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Data: 2022.07.29 09:27:04 -03'00'

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006

DATA DE INÍCIO: 01/07/2022
 DATA DE TÉRMINO: 30/07/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor Acumulado Medido: R\$ 556.586,98
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Saldo do Contrato: R\$ 20.314,69

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 576.901,67
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 470.132,06
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 88.454,92
VALOR ACUMULADO:	R\$ 558.586,98
PERCENTUAL REALIZADO:	96,82%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 20.314,69

Esta Medição: R\$ 88.454,92
 Valor Acumulado Medido: R\$ 556.586,98
 Saldo do Contrato: R\$ 20.314,69
 Valor do Contrato: R\$ 576.901,67

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

Processo Licitatório: 091/2021
 Contrato: 091/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
					QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)		
13.5	ORBE	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	R\$ 88,78	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	0,00	R\$ 0,00	
13.6	ORBE	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 60 MM (PIPOS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	R\$ 99,82	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	0,00	R\$ 0,00	
13.7	ORBE	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	R\$ 103,45	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	0,00	R\$ 0,00	
13.8	ORBE	1691	CAIXA DE GORRUBA - CG - 60 X 50 X 85 CM	UND	R\$ 369,49	1,00	R\$ 369,49	1,00	R\$ 369,49	1,00	R\$ 369,49	0,00	R\$ 0,00	
13.9	ORBE	4085	CAIXA DE INSERÇÃO Ø 60 X Ø 60 X 8 CM	UND	R\$ 376,52	5,00	R\$ 2.862,60	5,00	R\$ 2.862,60	5,00	R\$ 2.862,60	0,00	R\$ 0,00	
13.10	SINAPI	88053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 3,40 M³ (PARA 13 CONTRIBUÍTES), AF. 12/2020	UND	R\$ 2.172,11	1,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.172,11	
14.1	ORBE	10388	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 1200 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 2.608,90	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	0,00	R\$ 0,00	
14.2	ORBE	10389	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 1200 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 3.108,19	1,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.108,19	0,00	R\$ 0,00	
15.1	SINAPI	88831	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 390,97	5,00	R\$ 1.954,85	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.954,85	0,00	R\$ 0,00	
15.2	SINAPI	88933	BANCADEA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CUBA PLÁSTICA, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 286,98	2,00	R\$ 573,96	2,00	R\$ 573,96	2,00	R\$ 573,96	0,00	R\$ 0,00	
15.3	SINAPI	83396	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 853,53	2,00	R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 1.071,06	0,00	R\$ 0,00	
15.4	SINAPI	83441	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 810,22	1,00	R\$ 810,22	1,00	R\$ 810,22	1,00	R\$ 810,22	0,00	R\$ 0,00	
15.5	SINAPI	100688	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 285,98	4,00	R\$ 1.143,94	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.143,94	0,00	R\$ 0,00	
15.6	SINAPI	100688	MAGIÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 554,17	0,00	R\$ 0,00	
15.7	SINAPI	88872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 643,57	0,00	R\$ 0,00	
15.8	SINAPI	102257	OMNISORA BANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE, ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 90-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	M2	R\$ 285,81	11,87	R\$ 3.382,56	0,00	R\$ -	11,87	R\$ 3.382,56	0,00	R\$ 0,00	
15.9	SINAPI	88544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO ENGATE, AF. 01/2020	UM	R\$ 58,45	5,00	R\$ 292,25	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 292,25	0,00	R\$ 0,00	
16.1	SINAPI	83396	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	R\$ 810,22	1,00	R\$ 810,22	1,00	R\$ 810,22	1,00	R\$ 810,22	0,00	R\$ 0,00	
16.1.2	SINAPI	83358	RECAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 03/2016	M3	R\$ 3,07	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	0,00	R\$ 0,00	
16.2	SINAPI	83358	RECAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 03/2016	M3	R\$ 3,07	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	0,00	R\$ 0,00	

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:415893351487
 Data: 2022.07.29 09:28:58 -03'00'

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:415893351487
 Data: 2022.07.29 09:28:58 -03'00'

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:415893351487
 Data: 2022.07.29 09:28:58 -03'00'

Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 DATA DE INÍCIO: 01/07/2022
 DATA DE TÉRMINO: 30/07/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 30/07/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor Acumulado Medido: R\$ 558.586,98
 Saldo do Contrato: R\$ 20.314,69
 Valor do Contrato: R\$ 578.901,67

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

Processo Licitação: 061/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO: R\$ 578.901,67
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 470.132,08
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 88.454,92
 VALOR ACUMULADO: R\$ 558.586,98
 PERCENTUAL REALIZADO: 96,48%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 20.314,69



ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA CONTRATUAL		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)		
18.2.1	SINAPI	05241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIOS OU BAUTERS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	R\$ 25,83	28,50	R\$ 736,16	28,50	R\$ 736,16	28,50	R\$ 0,00	28,50	R\$ 736,16	0,00	R\$ 0,00
18.2.2	SINAPI	10106	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X28 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M3	R\$ 538,32	22,80	R\$ 12.273,70	22,80	R\$ 12.273,70	22,80	R\$ 0,00	22,80	R\$ 12.273,70	0,00	R\$ 0,00
18.2.3	SINAPI	02413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 6MPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACÕES, AF_09/2020	M2	R\$ 85,17	53,76	R\$ 5.116,34	53,76	R\$ 5.116,34	53,76	R\$ 0,00	53,76	R\$ 5.116,34	0,00	R\$ 0,00
18.2.4	SINAPI	02776	ARMADÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO CONVENIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	R\$ 16,33	157,85	R\$ 2.578,32	157,85	R\$ 2.578,32	157,85	R\$ 0,00	157,85	R\$ 2.578,32	0,00	R\$ 0,00
18.2.5	SINAPI	02718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCR = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	R\$ 549,35	2,02	R\$ 1.109,89	2,02	R\$ 1.109,89	2,02	R\$ 0,00	2,02	R\$ 1.109,89	0,00	R\$ 0,00
18.3	SINAPI	07503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 81X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_08/2014	M2	R\$ 65,01	171,00	R\$ 11.629,71	171,00	R\$ 11.629,71	171,00	R\$ 0,00	171,00	R\$ 11.629,71	0,00	R\$ 0,00
18.3.2	SINAPI	07893	CHAFISO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COULHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M2	R\$ 6,42	342,00	R\$ 2.195,64	342,00	R\$ 2.195,64	342,00	R\$ 0,00	342,00	R\$ 2.195,64	0,00	R\$ 0,00
18.3.3	SINAPI	07529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 100L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	R\$ 32,90	171,00	R\$ 5.625,90	171,00	R\$ 5.625,90	171,00	R\$ 0,00	171,00	R\$ 5.625,90	0,00	R\$ 0,00
18.3.4	ORSE	4301	ALAMBRAÇO (11T-2,00X0) COM TELA GALV, 27X2 (P41, 50X0), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CHIA 2X4, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTAIS), MURETA (140-50X4) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PINK LATEX AQUECIDO	M	R\$ 422,50	11,20	R\$ 4.732,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	11,20	R\$ 4.732,00	0,00	R\$ 4.732,00
18.3.5	ORSE	10891	QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2" COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTACADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E SOBRECADAS	M2	R\$ 487,66	7,88	R\$ 3.731,93	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	7,88	R\$ 3.731,93	0,00	R\$ 3.731,93
18.3.6	SINAPI	94892	EXECUÇÃO DE PASSAIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	R\$ 76,48	22,50	R\$ 1.720,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	22,50	R\$ 1.720,80	0,00	R\$ 1.720,80
18.4.1	SINAPI	88495	BLOCO DE PINTURA EM TINTA ACRILICA EM PAREDES, UMA IDEM, AF_08/2014	M2	R\$ 2,35	342,00	R\$ 803,70	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	342,00	R\$ 803,70	0,00	R\$ 0,00
18.4.2	SINAPI	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	M2	R\$ 13,87	342,00	R\$ 4.743,54	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	342,00	R\$ 4.743,54	0,00	R\$ 0,00
TOTAIS							578.901,67		470.132,08		88.454,92		558.586,98		20.314,69


Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:4158935148
 Dados: 2022.07.29 09:29:39
 -03'00"

Luiz Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 5º BM									
ITEM			DESCRIÇÃO	UNID.	UNIDADES			TOTAL	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES									
1,1	SINAPI	94777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SEMANAS		TOTAL	
			Carga horária		2,00	4,00		8,00	
			TOTAL					8,00	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2,1	SINAPI	94522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 04/2017	M3	ALTURA	LARGURA	COMPRIMENTO	REPETIÇÃO	
			Escavação do tubo de 100 água pluvial		0,40	0,30	56,00		6,72
			Escavação do tubo de 100 esgoto		0,40	0,30	34,00		4,08
			TOTAL						10,80
REVESTIMENTO									
6,5	ORSE	7323	PISO TÁtil DIRECIONAL E OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULIZAÇÃO DE BASE	M2	ÁREA (M²)				
			Conforme projeto de acessibilidade		12,5				12,50
			TOTAL						12,50
FORRO E COBERTA									
7,3	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 F	M2	ÁREA (M²)				
			ESPAÇO EXTERNO, COBERTO		13,3				
			S. AT. FAMILIAR 1		12,12				
			S. AT. FAMILIAR 2		12,12				
			SALA MULTIFUNDO		35,9				
			WC FNE		3,1				
			WC FNE		3,1				
			COFA		8,06				
			CIRCULAÇÃO		27,84				
			S. AT. INDIVIDUAL		9,09				
			S. AT. INDIVIDUAL		9,09				
			WC FEMININO		6,14				
			WC MASCULINO		6,14				
			S. ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO		12,12				
			RECEPÇÃO		24,71				
			ÁREA DE SERVIÇO COBERTA		7,48				
			TOTAL						190,31
ESQUADRIAS									
8,1	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 89X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	QUANT.				
			ESPAÇO EXTERNO, COBERTO		1,00				1,00
			S. AT. FAMILIAR 1		1,00				1,00
			S. AT. FAMILIAR 2		1,00				1,00
			WC FNE		1,00				1,00
			WC FNE		1,00				1,00
			COFA		1,00				1,00
			S. AT. INDIVIDUAL		1,00				1,00
			S. AT. INDIVIDUAL		1,00				1,00
			WC FEMININO		1,00				1,00
			WC MASCULINO		1,00				1,00
			S. ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO		1,00				1,00
			ÁREA DE SERVIÇO COBERTA		1,00				1,00
			TOTAL						13,00
			TOTAL MEDIDO 40% NO 3º BM						4,80
			SALDO MEDIDO						7,20
8,2	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUETA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF 12/2019	UND	QUANT.				
			SALA MULTIFUNDO		1,00				1,00
			RECEPÇÃO		1,00				1,00
			TOTAL						2,00
			TOTAL MEDIDO 40% NO 3º BM						0,80
			SALDO MEDIDO						1,20
PINTURA									
9,4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M²	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)			
			ESPAÇO EXTERNO, COBERTO		14,67	4,00		58,68	
			S. AT. FAMILIAR 1		14,07	2,60		36,582	
			S. AT. FAMILIAR 2		10,18	2,60		26,468	
			SALA MULTIFUNDO		25,93	2,60		67,418	
			WC FNE		7,13	2,60		18,538	

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487


Assinado de forma digital por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.07.29 09:30:25 -03'00'


Eng. Civil
CREA 1819847080

			WC PNE		7,13	2,60		18,538
			COPA		11,44	2,60		29,744
			CIRCULAÇÃO		35,58	2,60		92,508
			S. AT. INDIVIDUAL		12,05	2,60		31,33
			S. AT. INDIVIDUAL		12,05	2,60		31,33
			WC FEMININO		9,98	2,60		25,948
			WC MASCULINO		9,98	2,60		25,948
			S. ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO		14,07	2,60		36,582
			RECEPÇÃO		19,50	2,60		50,7
			ÁREA DE SERVIÇO COBERTA		7,59	4,00		30,36
			PAREDE EXTERNA		69,04	4,00		276,17
			TOTAL					856,84
9,5	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_862814	M2	ÁREA (M²)			
			ESPAÇO EXTERNO, COBERTO		13,30			
			S. AT. FAMILIAR 1		12,12			
			S. AT. FAMILIAR 2		12,12			
			SALA MULTIFUNÇÃO		35,90			
			WC PNE		3,10			
			WC PNE		3,10			
			COPA		8,06			
			CIRCULAÇÃO		27,84			
			S. AT. INDIVIDUAL		9,09			
			S. AT. INDIVIDUAL		9,09			
			WC FEMININO		6,14			
			WC MASCULINO		6,14			
			S. ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO		12,12			
			RECEPÇÃO		24,71			
			ÁREA DE SERVIÇO COBERTA		7,48			
			TOTAL					190,31
9,6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_862814	M2	ÁREA (M²)			
			ESPAÇO EXTERNO, COBERTO		13,30			
			S. AT. FAMILIAR 1		12,12			
			S. AT. FAMILIAR 2		12,12			
			SALA MULTIFUNÇÃO		35,90			
			WC PNE		3,10			
			WC PNE		3,10			
			COPA		8,06			
			CIRCULAÇÃO		27,84			
			S. AT. INDIVIDUAL		9,09			
			S. AT. INDIVIDUAL		9,09			
			WC FEMININO		6,14			
			WC MASCULINO		6,14			
			S. ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO		12,12			
			RECEPÇÃO		24,71			
			ÁREA DE SERVIÇO COBERTA		7,48			
			TOTAL					190,31
10,2	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122814	M	QUANT.			
			previsto para uso geral de instalações		500,00			500,00
			TOTAL					500,00
10,3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122814	M	QUANT.			
			previsto para uso geral de instalações		150,00			150,00
			TOTAL					150,00
10,4	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (3 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_812816	UND	QUANT.			
			S. At. familiar I		5,00			
			S. At. familiar II		5,00			
			Sala multifunção		9,00			
			S. de Atendimento individual		4,00			
			S. de Atendimento individual		4,00			
			S. Administração/atendimento		5,00			
			Recepção		7,00			
			Acesso		1,00			
			Circulação		2,00			
			Espaço externo coberto		1,00			
			WC PNE		1,00			
			WC PNE		1,00			
			Área de serviço		1,00			
			WC Feminino		1,00			
			WC Masculino		1,00			
			Copa		7,00			
			TOTAL					55,00
10,5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_812816	UND	QUANT.			
			Tomada dedicada para cada ponto de ar- condicionado		7,00			7,00
			TOTAL					7,00
10,6	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_812816	UND	QUANT.			

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2022.07.29 09:30:52
-03'00"


Eng. Civil
CREA 1819847080

			S. Al.familiar I		1,00			
			S. Al.familiar II		1,00			
			Sala multiuso		3,00			
			S. de Atendimento individual		1,00			
			S. de Atendimento individual		1,00			
			S. Administração/atendimento		1,00			
			Recepção		2,00			
			Acesso		1,00			
			Circulação		5,00			
			Espaço externo coberto		1,00			
			Jardim		1,00			
			WC PNE		1,00			
			WC PNE		1,00			
			Área de serviço		1,00			
			WC Feminino		1,00			
			WC Masculino		1,00			
			Copa		1,00			
			TOTAL					24,00
10,7	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.			
			Conforme projeto elétrico			11,00		
			TOTAL					11,00
10,8	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.			
			Conforme projeto elétrico			1,00		
			TOTAL					1,00
10,9	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.			
			Conforme projeto elétrico			1,00		
			TOTAL					1,00
10,10	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UM INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.			
			Conforme projeto elétrico			1,00		
			TOTAL					1,00
10,11	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	QUANT.			
			S. Al.familiar I		1,00			
			S. Al.familiar II		1,00			
			Sala multiuso		4,00			
			S. de Atendimento individual		1,00			
			S. de Atendimento individual		1,00			
			S. Administração/atendimento		1,00			
			Recepção		2,00			
			Acesso		1,00			
			Circulação		5,00			
			Espaço externo coberto		1,00			
			Jardim		1,00			
			WC PNE		1,00			
			WC PNE		1,00			
			Área de serviço		1,00			
			WC Feminino		1,00			
			WC Masculino		1,00			
			Copa		1,00			
			TOTAL					25,00
10,12	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	QUANT.			
			Conforme projeto elétrico			96,00		
			TOTAL					96,00
10,13	SINAPI	101546	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.			
			Conforme projeto elétrico			1,00		
			TOTAL					1,00
14.1	ORSE	10368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H (C) COMPRESSOR ROTATIVO	UND	QUANT.			
			S. at.familiar 1		1			
			S. at.familiar 2		1			
			S. at.individual		1			
			S. at.individual		1			
			S. administração/coordenação					
			TOTAL					5,00
14.2	ORSE	10369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H (C) COMPRESSOR ROTATIVO	UND	QUANT.			
			Sala multiuso		1			
			TOTAL					1

LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.07.29 09:31:24 -03'00'


 Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080





15,1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 48CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	QUANT.				
			WC PNE		1				
			WC PNE		1				
			WC FEMININO		2				
			WC MASCULINO		1				
			TOTAL						5,00
15,5	SINAPI	109868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	QUANT.				
			WC PNE		2,00				
			WC PNE		2,00				
			TOTAL						4,00
15,6	SINAPI	100838	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	QUANT.				
			WC MASCULINO		1,00				
			TOTAL						1,00
15,7	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	QUANT.				
			ÁREA DE SERVIÇO COBERTA		1,00				
			TOTAL						1,00
15,9	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UM	QUANT.				
			WC PNE		1,00				
			WC PNE		1,00				
			WC FEMININO		2,00				
			WC MASCULINO		1,00				
			TOTAL						5,00
16,4.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)	FACES		
			Conforme projeto		95,00	1,80	2,00		342,00
			TOTAL						342,00
16.4.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	COMPRIM. (M)	ALTURA (M)	FACES		
			Conforme projeto		95,00	1,80	2,00		342,00
			TOTAL						342,00

LUIZ AMERICO DE
MIRANDA
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por
LUIZ AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Data: 2022.07.29 09:33:24
03'00'


Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	BM 06
Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social - CREAS.		
 RIO BRANCO Construtora	 GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS	

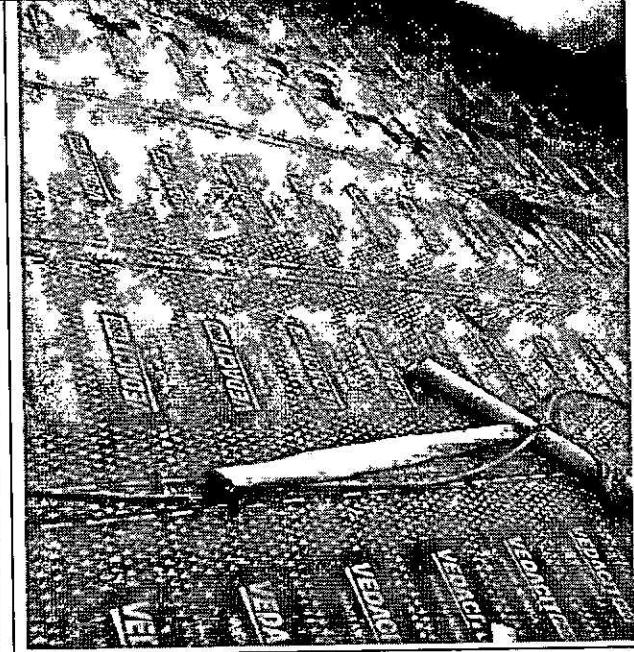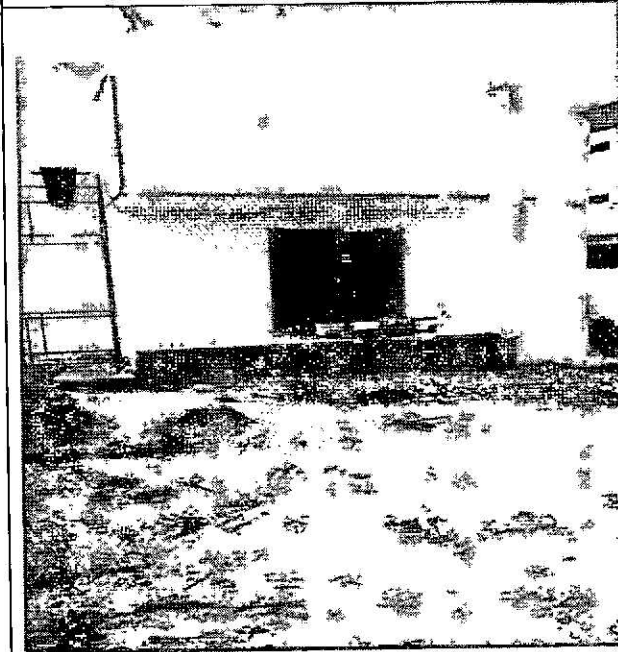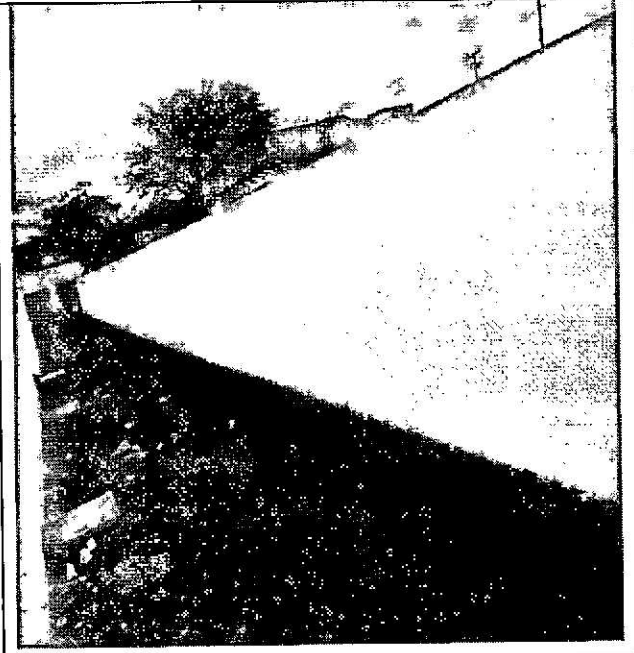



Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589551
 487
Dados: 2022.07.29 10:29:40 -03'00'

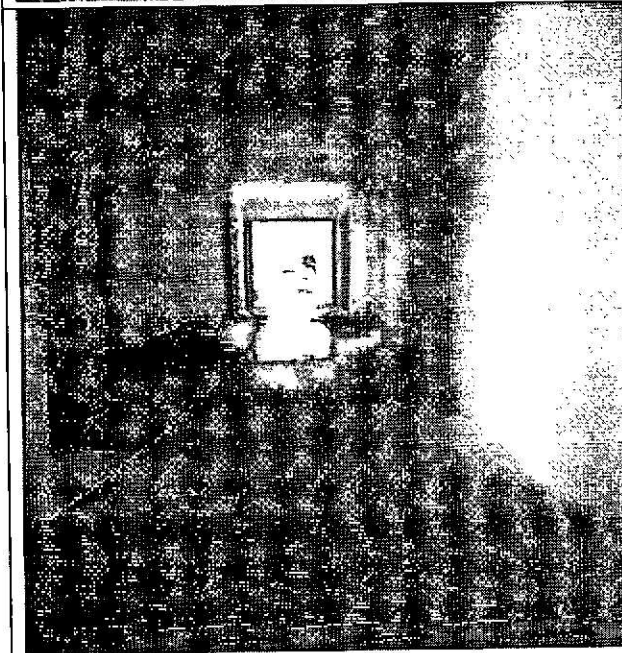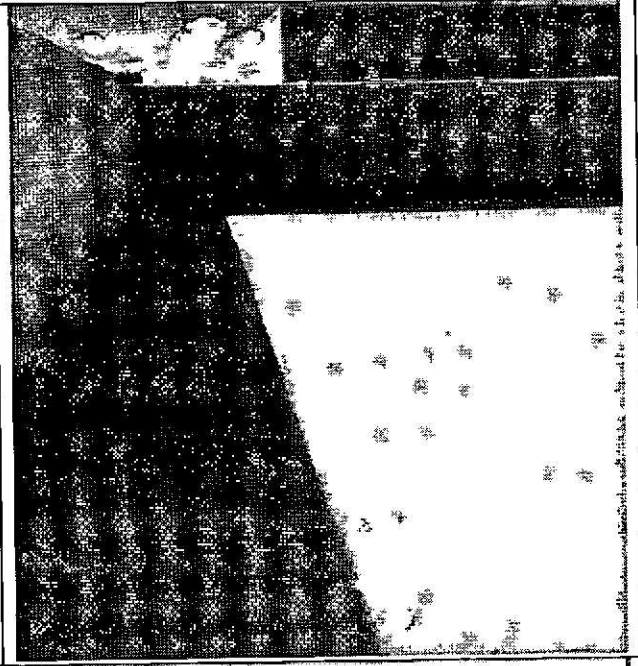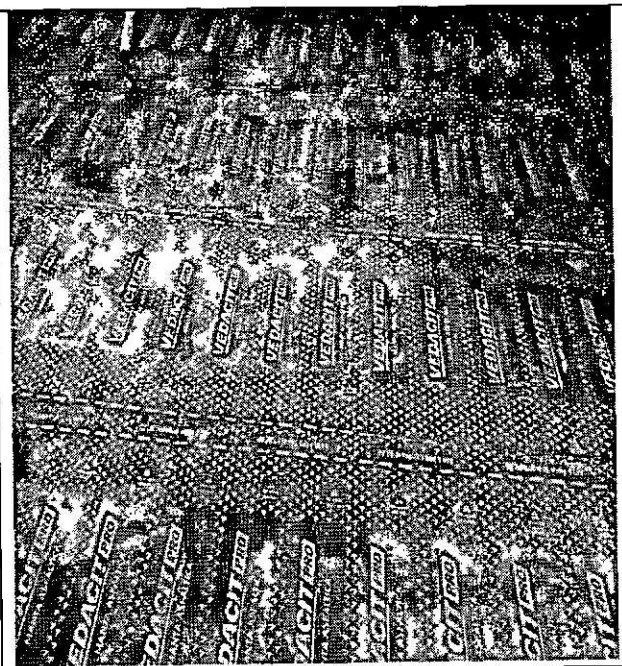RELATÓRIO FOTOGRAFICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	BM 06
Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social – CREAS.		
 RIO BRANCO Construtora	 GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS	




Luiz Américo de Miranda
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 487

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.07.29 10:30:00 -03'00'
