



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA ESCOLA AMENAYDE FARIAS DO REGO BARROS
 PROCESSO: Nº 127/2022 DESPENSA Nº 022/2022 CONTRATO Nº 172/2022
 LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, GRAVATÁ/PE
 EMPRESA: UNIONE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 04.719.230/0001-26
 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/01/23
 PERÍODO: 11/01/2023 e 30/01/2023

ORDEN DE SERVIÇO:
 PRAZO DE EXECUÇÃO:
 TRANSCORRIDO:
 PARALISAÇÃO:
 REINÍCIO:
 ADITIVO DE PRAZO:
 PRAZO RESTANTE:

11/01/2023
 30 DIAS
 19 DIAS
 0 DIAS
 11 DIAS

Resumo Financeiro
 VALOR DO CONTRATO
 VALOR REVISADO
 VALOR DESTA MEDIÇÃO
 VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES
 SALDO DO CONTRATO

valor (R\$)
 18.695,22
 18.695,22
 17.883,43
 17.883,43
 811,79

%
 100,00%
 95,68%
 95,68%
 4,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	FÍSICO			FINANCEIRO						
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	P.UNIT. CÍBIDI	CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO		
1			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
1.1	1	CPU	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 9 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC PI REDE COLETORES E JBS DN 150 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	8,00	0,00	8,00	R\$ 1.711,30	R\$ 13.690,40	R\$ 13.690,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	3	CPU	ANEL EM CONCRETO ARMADO, USO, PARA FOCOS DE INSPEÇÃO, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	7,00	7,00	R\$ 245,14	R\$ 1.715,98	R\$ 1.715,98				87,50%
1.3	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	1,00	R\$ 529,02	R\$ 529,02	R\$ 529,02				100,00%
1.4	101862	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	3,74	3,74	3,74	R\$ 40,07	R\$ 149,86	R\$ 149,86				100,00%
1.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,74	3,74	3,74	R\$ 16,80	R\$ 62,83	R\$ 62,83				100,00%
1.6	25	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	6,98	6,98	6,98	R\$ 18,81	R\$ 131,20	R\$ 131,20				100,00%
1.7	97033	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,00	11,85	11,85	R\$ 23,95	R\$ 431,10	R\$ 283,81				65,83%
1.8	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO LUMINÁCIAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_05/2014	M2	18,00	11,85	11,85	R\$ 68,19	R\$ 1.227,42	R\$ 808,05				65,83%
Ka3.9	2	CPU	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 256,09	R\$ 512,18	R\$ 512,18				100,00%

R\$ 18.695,22 R\$ 17.883,43 R\$ 17.883,42

Documento autenticado eletronicamente
 RODRIGO JOSE BATISTA XAVIER
 Data: 02/02/2023 12:52:10:00
 Verifique em <https://verificador.uber.br>



MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01

 OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA ESCOLA AMENAYDE FARIAS DO RÉGO BARROS
 LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, GRAVATÁ/PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
1		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
1.1	1	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 9 M, LARGURA DA VALA = 0,45 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORES ESGOTO JEI DN 160 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		REDE DO LADO DIREITO							4,00	4,00
		REDE DO LADO ESQUERDO							4,00	4,00
									TOTAL	8,00
1.2	3	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPEÇÃO, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		REDE LADO DIREITO							4,00	4,00
		REDE LADO ESQUERDO							3,00	3,00
									TOTAL	7,00
1.3	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 125 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,9 M. AF_12/2020	UN	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		COZINHA							1,00	1,00
									TOTAL	1,00
1.4	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		LADO ESQUERDO PROXIMO A CAIXA DE INSPEÇÃO			3,40	1,10				3,74
									TOTAL	3,74
1.5	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		LADO ESQUERDO PROXIMO A CAIXA DE INSPEÇÃO			3,40	1,10				3,74
									TOTAL	3,74
1.6	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	COMP.	LARG.	PROF / ALT	VOL.	TAXA	SUBTOTAL	
		REV CERAMICO						0,59	0,59	
		CONTRAPISO						1,08	1,08	
		OUTRO						5,31	5,31	
									TOTAL	6,98
1.7	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		PATIO			4,70	0,70				3,29
		PATIO			2,50	1,10				2,75
		PATIO			1,80	0,70				1,26
		PATIO			1,60	1,20				1,92
		PATIO			1,70	0,70				1,19
		PATIO			1,20	1,20				1,44
									TOTAL	11,85
1.8	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 6 M2 E 10 M2. AF_05/2014	M2	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		PATIO			4,70	0,70				3,29
		PATIO			2,50	1,10				2,75
		PATIO			1,80	0,70				1,26
		PATIO			1,60	1,20				1,92
		PATIO			1,70	0,70				1,19
		PATIO			1,20	1,20				1,44
									TOTAL	11,85
1.9	2	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,40M, H = 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL	
		CAIXA COLETORES DA CALÇADA							2,00	2,00
									TOTAL	2,00

 Kassio Barro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 17.030-DIPE

 Documento assinado digitalmente
 RODRIGO JOSE BATISTA XAVIER
 Data: 09/02/2023 12:55:21 -0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01



OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA ESCOLA AMENAYDE FARIAS DO REGO BARROS



FOTO 01: Vala para passagem dos tubos.



FOTO 02: Assentamento dos tubos de 150mm.



FOTO 03: Anel de concreto armado para poço.

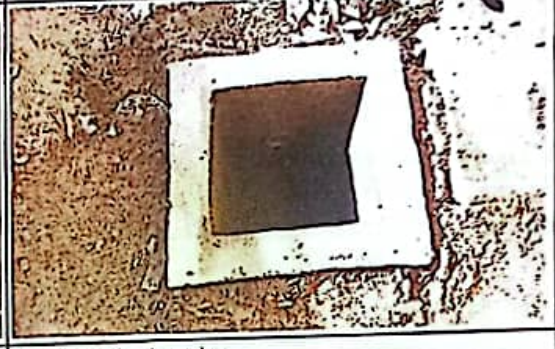


FOTO 04: Caixa de gordura.



FOTO 05: Demolição de revestimento cerâmico.



FOTO 06: Aplicação do revestimento cerâmico.



FOTO 07: Anel pré-moldado de concreto, h= 1,00.



FOTO 08: Coleta e carga de entulho.

Kassyr de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.390-D/PE



Documento assinado digitalmente
RODRIGO JOSE BATISTA XAVIER
Data: 09/07/2023 11:55:21 0300
Verifique em <https://verificador.sib.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000144	Nº da substituída
Data de Emissão 08-02-2023 As 21:42:05	Competência FEV/2023
Código de Verificação MJFF11073	Data Prest. de Serviço 08/02/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 04.719.929/0001-26 Inscrição Municipal: 033.569-0
Razão social: UNIONE CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AVN RUBER VAN DER LINDEN 377 APTO 102, 1 ANDAR HELIOPOLIS 55290-000
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 87-37621196 E-mail: unionerbx@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ/PAS: 11.049.830/0001-20
Endereço: N 268 Centro 55641-000 UF: PE
Município: Gravata E-mail: rmagalhaesjuridico@gmail.com
Telefone:

SERVIÇOS

7.01-ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRICULTURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO DA ESCOLA ALEMAYDE EARLAS DO REGO BARROS. CONTRATO 172/2022 - PERÍODO 11/01/2023 A 30/01/2023.	1,00	17.883,42	17.883,42

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:17.883,42

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 17.883,42	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 359,46	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRRF (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: M7120000 - Serviços De Engenharia
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
ISS devido ao município de Garanhuns.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0200/001

Dados do Fornecedor

Código 40784	Nome do Fornecedor UNIONE CONSTRUCOES LTDA		
Endereço AV RÜBER VAN DER LINDEN		Cidade GARANHUNS	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 04.719.929/0001-26		Dados bancários BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AMENAYDE FARIAS DO REGO BARROS, LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO - GRAVATA - PROCESSO 127/2022 - DISPENSA 022/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 30/01 NA ESCOLA AMENAYDE FARYAS - NF 144	Valor Bruto R\$: 17.883,42
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 11 00 4.4.90.51.99 12.361.1207.1318.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Adequação e Reforma da Rede Municipal de Educação Ficha: 287
0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Próprios

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data de Emissão 08/02/2023	Vencimento 08/02/2023	Saldo Anterior:	18.695,22
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	17.883,42
Requisição	Documento		Saldo Atual:	811,80

Descontos: ISS - PRINCIPAL 894,17	Valor Líquido R\$: 16.989,25
---	---

VALOR A SER PAGO R\$ **16.989,25**
dezessels mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos

Deduzido da dotação própria Data: 08/02/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	_____		
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
_____	_____	_____	_____
	Ordenador	Tesorreiro	

Conta: Data:	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 16.989,25 <i>dezessels mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos</i>
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____, Órgão Emissor: _____
	Em: ____/____/____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58
0922900922 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M GRAVATA MOVIMENTO
AGENCIA: 0922-9 CONTA: 3.379-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M GRAVATA MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0052-3 - GARAMUNS
CONTA: 153-6

FAVORECIDO: UNIONE CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 04.719.929/0001-26
VALOR: R\$ 16.989,25
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: A.E1A.C67.373.ABA.07F

Tranção efetuada com sucesso por: JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA.
