



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000494

Data e Hora de Emissão

11/11/2022 11:37:16

Código de Verificação

DYGQ-B3YB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.951.249/0001-08**

Inscrição Municipal: **406.616-2**

Nome/Razão Social: **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP**

Endereço: **RUA MIN NELSON HUNGRIA 63, SALA 0402 EDF NELSON HUNGRIA C - BOA VIAGEM - CEP: 51020-100**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **riobrancoconstrutora@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE GRAVATA**

CPF/CNPJ: **11.049.830/0001-20**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Cleto Campelo - Centro - CEP: 55641-000**

Município: **Gravatá**

UF: **PE**

E-mail: **licitacao.gravata@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATO Nº 089/2021, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SOUTO, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PREÇO 004/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021.

ART: **PE20220743650**

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

MÃO DE OBRA 40% E MATERIAL 60%

RETENÇÕES:

ISS: R\$ 663,53

IR: R\$ 331,77

INSS: R\$ 973,18

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO: AG 2518 / C/C 22192-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG 3018 / OP.003 / C/C 1702-8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,18	R\$ 331,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.117,77

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
8.847,11	0,00	13.270,66	5,00%	663,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será **RETIDO** pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Gravatá - PE
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: CO002/2022 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20220743650

Almir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080



RIO BRANCO Construtora

RECIBO

Valor Bruto	R\$ 22.117,77
INSS	R\$ 973,18
ISS	R\$ 663,53
IR	R\$ 331,77
Líquido a receber	R\$ 20.149,29

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância supra de R\$ 22.117,77 (vinte e dois mil, cento e dezessete reais e setenta e sete centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 494, relativo a 2ª Medição do aditivo de Contrato Nº 089/2021, referente a dos serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social – CREAS, localizado na rua Joaquim Souto, no município de Gravatá/PE, conforme proposta vencedora da tomada de preço 004/2021 - processo licitatório nº 061/2021, pelo qual damos a mais plena e geral quitação.

Segue abaixo os dados de nossa conta corrente para crédito do referido pagamento:

- ✓ BANCO BRADESCO AG - 2518 C/C – 22192-9 – Rio Branco Construtora Ltda.
- ✓ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG – 3018 / OP.003 / C/C – 1702-8

Recife/PE, 11 de novembro de 2022.

RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ nº 02.951.249/0001-08
Luiz Américo de Miranda Júnior
Diretor / Engenheiro Civil – CREA 23.272 D/PE
RG: 2.480.099 SSP/PE
CPF: 415.893.514-87

Praça Arsenal da Marinha, 35 Sl. 403 – Recife Antigo Recife PE CEP50030-360
CNPJ: 02.951.249/0001-08 E-mail: riobrancoconstrutora@hotmail.com
Fone/Fax: 81 3034-0010



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
 DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor Acumulado Medido: R\$ 664.863,78
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88
 VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 666.271,88
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 642.746,91
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 22.117,77
VALOR ACUMULADO:	R\$ 664.863,78
PERCENTUAL REALIZADO:	99,78%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 1.408,10

PLANTILHA DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA 1º REPROGRAMAÇÃO		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
						QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)			
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 114,87	128,00	R\$ 14.703,36	128,00	R\$ 14.703,36	128,00	R\$ 0,00	128,00	R\$ 14.703,36	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 27, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M2	R\$ 254,61	9,00	R\$ 2.291,49	9,00	R\$ 2.291,49	9,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 2.291,49	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	SINAPI	96524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	M2	R\$ 3,06	600,00	R\$ 1.836,00	600,00	R\$ 1.836,00	600,00	R\$ 0,00	600,00	R\$ 1.836,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF. 05/2018	M2	R\$ 89,15	31,50	R\$ 2.808,23	31,50	R\$ 2.808,23	31,50	R\$ 0,00	31,50	R\$ 2.808,23	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 10/2018	M	R\$ 47,13	60,90	R\$ 3.153,00	60,90	R\$ 3.153,00	60,90	R\$ 0,00	60,90	R\$ 3.153,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF. 04/2016	M2	R\$ 707,73	6,00	R\$ 4.246,38	6,00	R\$ 4.246,38	6,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 4.246,38	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	SINAPI	101606	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO) AF. 07/2020_P	UND	R\$ 1.781,25	1,00	R\$ 1.781,25	1,00	R\$ 1.781,25	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.781,25	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PRENSÃO DE FORMA AF. 06/2017	M3	R\$ 136,89	64,08	R\$ 11.509,71	64,08	R\$ 11.509,71	64,08	R\$ 0,00	64,08	R\$ 11.509,71	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	SINAPI	96519	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FUNDAMENTAÇÃO DE PAREDE AF. 03/2017	M3	R\$ 26,98	1,76	R\$ 47,49	1,76	R\$ 47,49	1,76	R\$ 0,00	1,76	R\$ 47,49	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF. 09/2020	M2	R\$ 113,28	87,29	R\$ 9.888,21	87,29	R\$ 9.888,21	87,29	R\$ 0,00	87,29	R\$ 9.888,21	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	36,30	R\$ 4.992,70	36,30	R\$ 4.992,70	36,30	R\$ 0,00	36,30	R\$ 4.992,70	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	SINAPI	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	R\$ 16,41	791,19	R\$ 12.983,43	791,19	R\$ 12.983,43	791,19	R\$ 0,00	791,19	R\$ 12.983,43	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 16,33	188,13	R\$ 3.072,16	188,13	R\$ 3.072,16	188,13	R\$ 0,00	188,13	R\$ 3.072,16	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 17,81	171,01	R\$ 3.045,69	171,01	R\$ 3.045,69	171,01	R\$ 0,00	171,01	R\$ 3.045,69	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	SINAPI	92716	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 12/2015	M3	R\$ 549,35	8,58	R\$ 4.713,42	8,58	R\$ 4.713,42	8,58	R\$ 0,00	8,58	R\$ 4.713,42	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 12/2015	M3	R\$ 377,89	6,61	R\$ 2.497,85	6,61	R\$ 2.497,85	6,61	R\$ 0,00	6,61	R\$ 2.497,85	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1	SINAPI	92289	ESTRUTURAS DE FORMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF. 09/2020	M2	R\$ 137,54	298,60	R\$ 41.069,45	298,60	R\$ 41.069,45	298,60	R\$ 0,00	298,60	R\$ 41.069,45	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	R\$ 16,33	1177,35	R\$ 19.226,09	1177,35	R\$ 19.226,09	1177,35	R\$ 0,00	1177,35	R\$ 19.226,09	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Admir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Amorim de Miranda Junior
 Sôcio Diretor Técnico e Administrativo
 CREA 23.272 A-72



Processo Licitatório: 08/1/2021
 Contrato: 089/2021
 BDI: 24,20%
 Prazo de execução: 08 (oito) meses

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
 DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Esta Medição: Valor Acumulado Medido: R\$ 22.117,77
 Valor do Contrato: R\$ 664.863,78
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO
 VALOR CONTRATO: R\$ 666.271,88
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 642.746,01
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 22.117,77
 VALOR ACUMULADO: R\$ 664.863,78
 PERCENTUAL REALIZADO: 99,79%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 1.408,10



ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PLANILHA DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1º REPROGRAMAÇÃO		PLANILHA DE MEDIÇÃO 01		TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
						(A) QUANT.	(B) QUANT.	(C) QUANT.	(D) QUANT.	(E) QUANT.								
4.3	SINAPI	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	R\$ 17,81	390,89	390,89	390,89	390,89	390,89	390,89	R\$ 6.961,75	390,89	R\$ 6.961,75	0,00	R\$ 6.961,75	0,00	R\$ 6.961,75
4.4	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MENOR OU PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 12/2015	M3	R\$ 548,35	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	R\$ 3.169,75	5,77	R\$ 3.169,75	0,00	R\$ 3.169,75	0,00	R\$ 3.169,75
4.5	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES; FOK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	R\$ 377,86	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	R\$ 4.341,96	11,49	R\$ 4.341,96	0,00	R\$ 4.341,96	0,00	R\$ 4.341,96
4.8	SINAPI	101863	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4), AF. 11/2020	M2	R\$ 146,87	229,21	229,21	229,21	229,21	229,21	229,21	R\$ 34.076,65	229,21	R\$ 34.076,65	0,00	R\$ 34.076,65	0,00	R\$ 34.076,65
4.7	SINAPI	101864	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIDA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF. 11/2020	M2	R\$ 138,55	233,06	233,06	233,06	233,06	233,06	233,06	R\$ 32.290,46	233,06	R\$ 32.290,46	0,00	R\$ 32.290,46	0,00	R\$ 32.290,46
4.8	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF. 06/2018	M2	R\$ 31,71	84,49	84,49	84,49	84,49	84,49	84,49	R\$ 2.679,18	84,49	R\$ 2.679,18	0,00	R\$ 2.679,18	0,00	R\$ 2.679,18
5	SINAPI	87692	SERVIÇOS EM ALVENARIA, 1,5 M DE ALTURA, 1,5 M DE LARGURA, CONTRAVENTO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEQUO, ESPESURA 5CM, AF. 06/2014	M2	R\$ 47,57	228,16	228,16	228,16	228,16	228,16	228,16	R\$ 10.853,57	228,16	R\$ 10.853,57	0,00	R\$ 10.853,57	0,00	R\$ 10.853,57
5.1	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 09/2016	M	R\$ 50,09	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	R\$ 1.622,92	32,40	R\$ 1.622,92	0,00	R\$ 1.622,92	0,00	R\$ 1.622,92
5.2	SINAPI	93185	CONTRAVENTO PRÉ-MOLDADO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE CONFIRMINDO	M	R\$ 45,35	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	R\$ 1.469,34	32,40	R\$ 1.469,34	0,00	R\$ 1.469,34	0,00	R\$ 1.469,34
5.4	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 09/2016	M	R\$ 49,37	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	R\$ 1.098,01	22,20	R\$ 1.098,01	0,00	R\$ 1.098,01	0,00	R\$ 1.098,01
5.5	SINAPI	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M2	R\$ 90,48	533,67	533,67	533,67	533,67	533,67	533,67	R\$ 48.286,46	533,67	R\$ 48.286,46	0,00	R\$ 48.286,46	0,00	R\$ 48.286,46
6.1	SINAPI	87878	REVESTIMENTO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/20	M2	R\$ 4,06	1033,92	1033,92	1033,92	1033,92	1033,92	1033,92	R\$ 4.197,72	1033,92	R\$ 4.197,72	0,00	R\$ 4.197,72	0,00	R\$ 4.197,72
6.2	SINAPI	87775	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	R\$ 51,54	1033,92	1033,92	1033,92	1033,92	1033,92	1033,92	R\$ 53.288,23	1033,92	R\$ 53.288,23	0,00	R\$ 53.288,23	0,00	R\$ 53.288,23
6.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF. 06/2014	M2	R\$ 44,14	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	201,25	R\$ 8.883,17	201,25	R\$ 8.883,17	0,00	R\$ 8.883,17	0,00	R\$ 8.883,17
6.4	SINAPI	87273	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES, AF. 06/2014	M2	R\$ 61,39	132,38	132,38	132,38	132,38	132,38	132,38	R\$ 8.126,81	132,38	R\$ 8.126,81	0,00	R\$ 8.126,81	0,00	R\$ 8.126,81
6.5	ORSE	7323	PISO TÁIL DIRECIONAL E/OU ALERTIA, EM BORRACHA, PUFFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO EXCLUSIVO REGULAZIÇÃO DE BASE	M	R\$ 404,82	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	R\$ 5.060,25	12,50	R\$ 5.060,25	0,00	R\$ 5.060,25	0,00	R\$ 5.060,25

Almir Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli EPP
 Luiz Américo de Miranda Junior
 Sôcio Diretor Técnico e Administrativo
 Engenheiro Civil - CREA 1.277.125



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
 DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022



Valor Acumulado Medido: **R\$ 664.863,78**
 Valor do Contrato: **R\$ 666.271,88**
 Valor Acumulado Medido: **R\$ 1.408,10**
 Valor do Contrato: **R\$ 666.271,88**

PLANO DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA 1º REPROGRAMAÇÃO		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
7.1	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	R\$ 15,70	151,79	R\$ 2.383,10	151,79	R\$ 2.383,10	151,79	R\$ 0,00	151,79	R\$ 2.383,10	0,00	R\$ 0,00
7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 60,86	151,79	R\$ 9.237,94	151,79	R\$ 9.237,94	151,79	R\$ 0,00	151,79	R\$ 9.237,94	0,00	R\$ 0,00
7.3	SINAPI	95109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	R\$ 37,56	201,25	R\$ 7.568,95	201,25	R\$ 7.568,95	201,25	R\$ 0,00	201,25	R\$ 7.568,95	0,00	R\$ 0,00
7.4	SINAPI	100327	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	R\$ 54,25	65,00	R\$ 3.528,25	65,00	R\$ 3.528,25	65,00	R\$ 0,00	65,00	R\$ 3.528,25	0,00	R\$ 0,00
8.1	SINAPI	90796	ESQUADRIAS: KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 499,50	12,00	R\$ 5.994,00	12,00	R\$ 5.994,00	12,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 5.994,00	0,00	R\$ 0,00
8.2	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X103,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UND	R\$ 583,60	2,00	R\$ 1.167,20	2,00	R\$ 1.167,20	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.167,20	0,00	R\$ 0,00
8.3	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LANBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 744,32	3,24	R\$ 2.411,60	3,24	R\$ 2.411,60	3,24	R\$ 0,00	3,24	R\$ 2.411,60	0,00	R\$ 0,00
8.4	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CLINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 154,19	14,00	R\$ 2.158,66	14,00	R\$ 2.158,66	14,00	R\$ 0,00	14,00	R\$ 2.158,66	0,00	R\$ 0,00
8.5	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 3.459,14	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.459,14	0,00	R\$ 0,00
8.6	COMPOSIÇÃO	1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 125X210 CM, ESPESURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	R\$ 2.695,95	1,00	R\$ 2.695,95	1,00	R\$ 2.695,95	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.695,95	0,00	R\$ 0,00
8.7	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 623,00	23,17	R\$ 14.434,91	23,17	R\$ 14.434,91	23,17	R\$ 0,00	23,17	R\$ 14.434,91	0,00	R\$ 0,00
8.8	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 317,14	4,44	R\$ 1.408,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,44	R\$ 1.408,10
8.9	SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	R\$ 207,96	23,17	R\$ 4.819,13	23,17	R\$ 4.819,13	23,17	R\$ 0,00	23,17	R\$ 4.819,13	0,00	R\$ 0,00
9.1	SINAPI	89485	PINTURA: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 2,35	931,30	R\$ 2.188,55	931,30	R\$ 2.188,55	931,30	R\$ 0,00	931,30	R\$ 2.188,55	0,00	R\$ 0,00
9.2	SINAPI	99135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DIAS, DEMÓS. AF_05/2017	M2	R\$ 22,84	439,66	R\$ 9.953,90	439,66	R\$ 9.953,90	439,66	R\$ 0,00	439,66	R\$ 9.953,90	0,00	R\$ 0,00
9.3	SINAPI	89497	APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DIAS, DEMÓS. AF_06/2014	M2	R\$ 12,83	491,64	R\$ 6.307,74	491,64	R\$ 6.307,74	491,64	R\$ 0,00	491,64	R\$ 6.307,74	0,00	R\$ 0,00
9.4	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DIAS, DEMÓS. AF_06/2014	M2	R\$ 13,87	931,30	R\$ 12.917,13	931,30	R\$ 12.917,13	931,30	R\$ 0,00	931,30	R\$ 12.917,13	0,00	R\$ 0,00

Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Américo de Miranda Júnior
 Srvco Diretor Técnico e Administrativo
 Engenharia Civil - CREA 23.773.61.25



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
 DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022

Valor do Contrato: R\$ 666.271,88
 Valor Acumulado Medido: R\$ 664.863,78
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO: R\$ 666.271,88
 VALOR JÁ REALIZADO: R\$ 642.746,01
 VALOR DO BOLETIM: R\$ 22.117,77
 VALOR ACUMULADO: R\$ 664.863,78
 PERCENTUAL REALIZADO: 99,79%
 SALDO CONTRATUAL: R\$ 1.406,10

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PLANOILHA DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO		PLANOILHA DE MEDIÇÃO 1º REPROGRAMAÇÃO		PLANOILHA DE MEDIÇÃO 1º ADITIVO		PLANOILHA DE MEDIÇÃO 1º ADITIVO		PLANOILHA DE MEDIÇÃO 1º ADITIVO	
						QUANT.	TOTAL OBRAS COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL OBRAS COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL OBRAS COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL OBRAS COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL OBRAS COM BDI (R\$)
9.5	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	R\$ 18,11	201,25	R\$ 3.644,63	201,25	R\$ 3.644,63	201,25	R\$ 3.644,63	201,25	R\$ 3.644,63	0,00	R\$ 0,00
9.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	R\$ 15,70	201,25	R\$ 3.159,63	201,25	R\$ 3.159,63	201,25	R\$ 3.159,63	201,25	R\$ 3.159,63	0,00	R\$ 0,00
10	SINAPI	91864	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ELÉTRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 14,21	30,00	R\$ 426,30	30,00	R\$ 426,30	30,00	R\$ 426,30	30,00	R\$ 426,30	0,00	R\$ 0,00
10.2	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6710 KV, PARA C/ M R CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 5,28	500,00	R\$ 2.640,00	500,00	R\$ 2.640,00	500,00	R\$ 2.640,00	500,00	R\$ 2.640,00	0,00	R\$ 0,00
10.3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6710 KV, PARA C/ R CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	R\$ 10,02	150,00	R\$ 1.503,00	150,00	R\$ 1.503,00	150,00	R\$ 1.503,00	150,00	R\$ 1.503,00	0,00	R\$ 0,00
10.4	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	R\$ 188,67	55,00	R\$ 10.376,85	55,00	R\$ 10.376,85	55,00	R\$ 10.376,85	55,00	R\$ 10.376,85	0,00	R\$ 0,00
10.5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20x250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UND	R\$ 171,68	7,00	R\$ 1.201,76	7,00	R\$ 1.201,76	7,00	R\$ 1.201,76	7,00	R\$ 1.201,76	0,00	R\$ 0,00
10.6	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UND	R\$ 137,17	24,00	R\$ 3.292,08	24,00	R\$ 3.292,08	24,00	R\$ 3.292,08	24,00	R\$ 3.292,08	0,00	R\$ 0,00
10.7	SINAPI	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 10,48	11,00	R\$ 115,28	11,00	R\$ 115,28	11,00	R\$ 115,28	11,00	R\$ 115,28	0,00	R\$ 0,00
10.8	SINAPI	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	1,00	R\$ 11,02	0,00	R\$ 0,00
10.9	SINAPI	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	0,00	R\$ 0,00
10.1	SINAPI	93856	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	1,00	R\$ 12,07	0,00	R\$ 0,00
10.11	SINAPI	97592	LUMINÁRIA POU-LIFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 1213 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UND	R\$ 41,92	25,00	R\$ 1.048,00	25,00	R\$ 1.048,00	25,00	R\$ 1.048,00	25,00	R\$ 1.048,00	0,00	R\$ 0,00
10.12	SINAPI	101651	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16 MM², 0,6710 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	R\$ 16,75	96,00	R\$ 1.608,00	96,00	R\$ 1.608,00	96,00	R\$ 1.608,00	96,00	R\$ 1.608,00	0,00	R\$ 0,00
10.13	SINAPI	101948	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	1,00	R\$ 125,95	0,00	R\$ 0,00
10.14	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	R\$ 383,65	3,00	R\$ 1.160,95	3,00	R\$ 1.160,95	3,00	R\$ 1.160,95	3,00	R\$ 1.160,95	0,00	R\$ 0,00
11	SINAPI	89402	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	M	R\$ 8,71	40,75	R\$ 354,93	40,75	R\$ 354,93	40,75	R\$ 354,93	40,75	R\$ 354,93	0,00	R\$ 0,00
11.2	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	R\$ 126,08	19,00	R\$ 2.395,14	19,00	R\$ 2.395,14	19,00	R\$ 2.395,14	19,00	R\$ 2.395,14	0,00	R\$ 0,00
11.3	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	M	R\$ 14,53	26,90	R\$ 389,40	26,90	R\$ 389,40	26,90	R\$ 389,40	26,90	R\$ 389,40	0,00	R\$ 0,00

Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Américo de Miranda Junior
 Sócio Diretor Técnico e Administrativo
 Engenheiro Civil: 5.615.233/31.71.7E



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
 DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Esta Medição: Valor Acumulado Medido: R\$ 664.863,78
 Valor do Contrato: R\$ 1.408,10
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA
 VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 666.271,88
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 642.746,01
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 22.117,77
VALOR ACUMULADO:	R\$ 664.863,78
PERCENTUAL REALIZADO:	99,79%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 1.408,10



PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA 1ª REPROGRAMAÇÃO		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
11,4	SINAPI	89382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014.	UND	R\$ 7,84	12,00	R\$ 94,08	12,00	R\$ 94,08	12,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 94,08	0,00	R\$ 0,00
11,5	SINAPI	89396	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014.	UND	R\$ 9,70	4,00	R\$ 39,80	4,00	R\$ 39,80	4,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 39,80	0,00	R\$ 0,00
11,6	SINAPI	89392	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014.	UND	R\$ 30,21	7,00	R\$ 211,47	7,00	R\$ 211,47	7,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 211,47	0,00	R\$ 0,00
11,7	SINAPI	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014.	UND	R\$ 17,82	3,00	R\$ 53,46	3,00	R\$ 53,46	3,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 53,46	0,00	R\$ 0,00
11,8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014.	M	R\$ 11,94	18,00	R\$ 214,92	18,00	R\$ 214,92	18,00	R\$ 0,00	18,00	R\$ 214,92	0,00	R\$ 0,00
11,9	SINAPI	89503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	R\$ 845,48	2,00	R\$ 1.690,96	2,00	R\$ 1.690,96	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.690,96	0,00	R\$ 0,00
12,1	SINAPI	89578	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF. 12/2014.	M	R\$ 40,07	38,00	R\$ 1.442,52	38,00	R\$ 1.442,52	38,00	R\$ 0,00	38,00	R\$ 1.442,52	0,00	R\$ 0,00
12,2	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014.	M	R\$ 59,40	27,71	R\$ 1.645,97	27,71	R\$ 1.645,97	27,71	R\$ 0,00	27,71	R\$ 1.645,97	0,00	R\$ 0,00
12,3	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 60 X 60 X 0,60M	UN	R\$ 576,52	16,00	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 9.224,32	16,00	R\$ 0,00	16,00	R\$ 9.224,32	0,00	R\$ 0,00
12,4	SINAPI	94227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2016.	M	R\$ 60,15	43,78	R\$ 2.633,37	43,78	R\$ 2.633,37	43,78	R\$ 0,00	43,78	R\$ 2.633,37	0,00	R\$ 0,00
13,1	SINAPI	89714	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014.	M	R\$ 50,45	32,78	R\$ 1.653,75	32,78	R\$ 1.653,75	32,78	R\$ 0,00	32,78	R\$ 1.653,75	0,00	R\$ 0,00
13,2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014.	M	R\$ 28,18	21,32	R\$ 598,16	21,32	R\$ 598,16	21,32	R\$ 0,00	21,32	R\$ 598,16	0,00	R\$ 0,00
13,3	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014.	M	R\$ 17,82	6,00	R\$ 106,92	6,00	R\$ 106,92	6,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 106,92	0,00	R\$ 0,00
13,4	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014.	UND	R\$ 11,81	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 47,24	4,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 47,24	0,00	R\$ 0,00
13,5	ORSE	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, W.C.TÓRNICOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	R\$ 68,78	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 619,02	9,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 619,02	0,00	R\$ 0,00
13,6	ORSE	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	R\$ 99,82	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 199,64	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 199,64	0,00	R\$ 0,00
13,7	ORSE	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	R\$ 103,45	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 517,25	5,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 517,25	0,00	R\$ 0,00
13,8	ORSE	1691	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UND	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 368,48	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 368,48	0,00	R\$ 0,00
13,9	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UND	R\$ 576,52	7,00	R\$ 4.035,64	7,00	R\$ 4.035,64	7,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 4.035,64	0,00	R\$ 0,00
13,10	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 3483 EL (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020.	UND	R\$ 2.172,11	0,00	-	0,00	-	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
14,1	ORSE	10386	ARCONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 2.808,80	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 14.034,00	5,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 14.034,00	0,00	R\$ 0,00
14,2	ORSE	10388	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UND	R\$ 3.106,19	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 6.212,38	0,00	R\$ 0,00
14,3	ORSE	10389	APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	UND	R\$ 3.106,19	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 6.212,38	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 6.212,38	0,00	R\$ 0,00

RIO BRANCO Construtora EIRELI - EPP
 Luiz Américo de Miranda Júnior
 Engenheiro Civil - CREA 1819847080

Amir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
 DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022



Valor Acumulado Medido: R\$ 664.863,78
 Valor do Contrato: R\$ 866.271,88

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO TOTAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)		
15.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 390,57	5,00	R\$ 1.954,85	5,00	R\$ 1.954,85	5,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 1.954,85	0,00	R\$ 0,00
15.2	SINAPI	86933	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 286,98	2,00	R\$ 573,96	2,00	R\$ 573,96	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 573,96	0,00	R\$ 0,00
15.3	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 535,53	2,00	R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 1.071,06	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.071,06	0,00	R\$ 0,00
15.4	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE PVC, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 918,22	1,00	R\$ 918,22	1,00	R\$ 918,22	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 918,22	0,00	R\$ 0,00
15.5	SINAPI	100868	SARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UND	R\$ 285,86	4,00	R\$ 1.143,44	4,00	R\$ 1.143,44	4,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.143,44	0,00	R\$ 0,00
15.6	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	1,00	R\$ 554,17	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 554,17	0,00	R\$ 0,00
15.7	SINAPI	86672	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	1,00	R\$ 643,57	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 643,57	0,00	R\$ 0,00
15.8	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 659 X 204, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERROGÊNES AF. 01/2021	M2	R\$ 285,81	0,00	-	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
15.9	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UM	R\$ 58,45	5,00	R\$ 292,25	5,00	R\$ 292,25	5,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 292,25	0,00	R\$ 0,00
16.1	SINAPI	83358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	R\$ 3,07	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 87,50	28,50	R\$ 0,00	28,50	R\$ 87,50	0,00	R\$ 0,00
16.2.1	SINAPI	95241	MURO - ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	M2	R\$ 25,83	28,50	R\$ 736,16	28,50	R\$ 736,16	28,50	R\$ 0,00	28,50	R\$ 736,16	0,00	R\$ 0,00
16.2.2	SINAPI	101166	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RÁPIDOS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M3	R\$ 538,32	22,80	R\$ 12.273,70	22,80	R\$ 12.273,70	22,80	R\$ 0,00	22,80	R\$ 12.273,70	0,00	R\$ 0,00
16.2.3	SINAPI	92413	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	R\$ 95,17	53,78	R\$ 5.116,34	53,78	R\$ 5.116,34	53,78	R\$ 0,00	53,78	R\$ 5.116,34	0,00	R\$ 0,00
16.2.4	SINAPI	92776	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	KG	R\$ 16,33	157,95	R\$ 2.579,32	157,95	R\$ 2.579,32	157,95	R\$ 0,00	157,95	R\$ 2.579,32	0,00	R\$ 0,00
16.2.5	SINAPI	92716	ARMADAÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO CONVENCIONAL DE SOBROADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	M3	R\$ 549,35	2,02	R\$ 1.109,69	2,02	R\$ 1.109,69	2,02	R\$ 0,00	2,02	R\$ 1.109,69	0,00	R\$ 0,00
16.3.1	SINAPI	87503	MURO - ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X24 (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	R\$ 68,01	171,00	R\$ 11.629,71	171,00	R\$ 11.629,71	171,00	R\$ 0,00	171,00	R\$ 11.629,71	0,00	R\$ 0,00

Amir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Luiz Américo de Miranda Junior
 Engenheiro Civil - CREA 23.272 D-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
 DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
 DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022



Valor Acumulado Medido: R\$ 664.863,78
 Valor do Contrato: R\$ 666.271,88

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA

VISTO DA EMPRESA

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATO:	R\$ 666.271,88
VALOR JÁ REALIZADO:	R\$ 642.746,01
VALOR DO BOLETIM:	R\$ 22.117,77
VALOR ACUMULADO:	R\$ 664.863,78
PERCENTUAL REALIZADO:	99,79%
SALDO CONTRATUAL:	R\$ 1.408,10

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
						QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)					
16.3.2	SINAPI	87933	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	R\$ 6,42	342,00	R\$ 2.195,64	342,00	R\$ 2.195,64	342,00	R\$ 0,00	342,00	R\$ 2.195,64	0,00	R\$ 2.195,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
16.3.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 32,90	171,00	R\$ 5.625,90	171,00	R\$ 5.625,90	171,00	R\$ 0,00	171,00	R\$ 5.625,90	0,00	R\$ 5.625,90	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
16.3.4	ORSE	4301	ALAMBRADO (HT=2,00M) COM TELA GALV 2"X2" (H=1,50M), MONTADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTALS), MURETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVALÁTEX 2 DEMÃOS	M	R\$ 422,50	11,20	R\$ 4.732,00	11,20	R\$ 4.732,00	11,20	R\$ 0,00	11,20	R\$ 4.732,00	0,00	R\$ 4.732,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
16.3.5	ORSE	10891	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTACADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	M2	R\$ 487,86	11,76	R\$ 5.499,68	7,96	R\$ 3.731,93	11,76	R\$ 1.767,75	11,76	R\$ 5.499,68	0,00	R\$ 5.499,68	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
16.3.6	SINAPI	94592	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 76,48	124,10	R\$ 9.491,17	124,10	R\$ 9.491,17	124,10	R\$ 0,00	124,10	R\$ 9.491,17	0,00	R\$ 9.491,17	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
16.4.1	SINAPI	88485	MURO - PINTURA, APLICADO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 2,35	342,00	R\$ 803,70	342,00	R\$ 803,70	342,00	R\$ 0,00	342,00	R\$ 803,70	0,00	R\$ 803,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
16.4.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 13,87	342,00	R\$ 4.743,64	342,00	R\$ 4.743,64	342,00	R\$ 0,00	342,00	R\$ 4.743,64	0,00	R\$ 4.743,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.1	SINAPI	94319	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 45,27	94,73	R\$ 4.288,43	94,73	R\$ 4.288,43	94,73	R\$ 0,00	94,73	R\$ 4.288,43	0,00	R\$ 4.288,43	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	R\$ 11,88	14,00	R\$ 167,72	14,00	R\$ 167,72	14,00	R\$ 0,00	14,00	R\$ 167,72	0,00	R\$ 167,72	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.3	SINAPI	102218	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PÓSICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 12,29	17,55	R\$ 215,69	17,55	R\$ 215,69	17,55	R\$ 0,00	17,55	R\$ 215,69	0,00	R\$ 215,69	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.4	SINAPI	5057	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	R\$ 996,27	1,00	R\$ 996,27	1,00	R\$ 996,27	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 996,27	0,00	R\$ 996,27	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.5	SINAPI	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE OU GRANITO BRANCO/CHAMIZADA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_04/2020	M2	R\$ 592,22	11,87	R\$ 7.029,65	11,87	R\$ 7.029,65	11,87	R\$ 0,00	11,87	R\$ 7.029,65	0,00	R\$ 7.029,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.5	SINAPI	98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_08/2016	M2	R\$ 66,66	40,84	R\$ 2.722,39	40,84	R\$ 2.722,39	40,84	R\$ 0,00	40,84	R\$ 2.722,39	0,00	R\$ 2.722,39	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.7	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_09/2016	M2	R\$ 82,40	40,84	R\$ 3.385,22	40,84	R\$ 3.385,22	40,84	R\$ 0,00	40,84	R\$ 3.385,22	0,00	R\$ 3.385,22	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	R\$ 38,03	46,33	R\$ 1.761,93	46,33	R\$ 1.761,93	46,33	R\$ 0,00	46,33	R\$ 1.761,93	0,00	R\$ 1.761,93	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
17.9	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (Ø), PARA 1 MEDIDOR FORNHECIDO E INSTALADO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	UN	R\$ 142,64	1,00	R\$ 142,64	1,00	R\$ 142,64	1,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 142,64	0,00	R\$ 142,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Almir Ribeiro
 Eng.º Civil
 CREA 1819847080

Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Américo de Miranda Júnior
 Sócio Diretor Técnico e Administrativo
 CREA 23.273 D, 2 E



COMPROMISSO COM AS PESSOAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 ADITIVO

DATA DE INÍCIO: 01/09/2022
DATA DE TÉRMINO: 08/11/2022
DATA ELABORAÇÃO: 08/11/2022

Empresa: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor do Contrato: R\$ 666.271,88
Valor do Contrato: R\$ 1.408,10
Valor da Empresa: R\$ 666.271,88

Valor Contrato: R\$ 666.271,88
Valor Já Realizado: R\$ 642.746,01
Valor do Boletim: R\$ 22.117,77
Valor Acumulado: R\$ 664.863,78
Percentual Realizado: 99,79%
Saldo Contratual: R\$ 1.408,10

ITEM	TABELA DE REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	(A) PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO		(B) ACUMULADO ANTERIOR		(C) ESTA MEDIÇÃO		(D) ACUMULADO ATUAL		(E) SALDO CONTRATUAL	
						QUANT.	TOTAL OBRA COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT.	TOTAL COM BDI (R\$)
17.10	SINAPI	97807	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	R\$ 92,46	2,00	R\$ 184,92	2,00	R\$ 184,92	2,00	R\$ 184,92	2,00	R\$ 184,92	0,00	R\$ 0,00
17.11	SINAPI	88504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	R\$ 13,69	75,30	R\$ 1.030,86	75,30	R\$ 1.030,86	75,30	R\$ 1.030,86	75,30	R\$ 1.030,86	0,00	R\$ 0,00
17.12	SINAPI	88228	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 22,50	288,00	R\$ 6.480,00	288,00	R\$ 6.480,00	288,00	R\$ 6.480,00	288,00	R\$ 6.480,00	0,00	R\$ 0,00
17.13	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 1,91	757,84	R\$ 1.447,47	757,84	R\$ 1.447,47	757,84	R\$ 1.447,47	757,84	R\$ 1.447,47	0,00	R\$ 0,00
17.14	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 6,91	94,73	R\$ 654,58	94,73	R\$ 654,58	94,73	R\$ 654,58	94,73	R\$ 654,58	0,00	R\$ 0,00
17.15	SINAPI	101168	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	R\$ 65,23	67,25	R\$ 4.386,72	67,25	R\$ 4.386,72	67,25	R\$ 4.386,72	67,25	R\$ 4.386,72	0,00	R\$ 0,00
17.16	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUÍ (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPARTIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRELENTIMENTOS. AF. 08/2016 - P	M	R\$ 37,78	29,40	R\$ 1.110,73	29,40	R\$ 1.110,73	29,40	R\$ 1.110,73	29,40	R\$ 1.110,73	0,00	R\$ 0,00
17.17	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM. AF. 07/2019	M3	R\$ 102,46	6,74	R\$ 690,58	6,74	R\$ 690,58	6,74	R\$ 690,58	6,74	R\$ 690,58	0,00	R\$ 0,00
17.18	SINAPI	98598	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	R\$ 59,68	20,00	R\$ 1.193,60	20,00	R\$ 1.193,60	20,00	R\$ 1.193,60	20,00	R\$ 1.193,60	0,00	R\$ 0,00
17.19	SINAPI	98518	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	R\$ 350,94	4,00	R\$ 1.403,76	4,00	R\$ 1.403,76	4,00	R\$ 1.403,76	4,00	R\$ 1.403,76	0,00	R\$ 0,00
17.20	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,172 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRAOIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 - P	M	R\$ 441,74	2,50	R\$ 1.104,35	2,50	R\$ 1.104,35	2,50	R\$ 1.104,35	2,50	R\$ 1.104,35	0,00	R\$ 0,00
				TOTALS		666.271,88	642.746,01	22.117,77	664.863,78		1.408,10				

Amir Ribeiro
Eng. Civil
CREA 1819847080


Luz Américo de Miranda Júnior
Engenheiro Técnico Administrativo
CREA 20.272-D-1 PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BM ADITIVO								
ITEM			DESCRIÇÃO	UNID.	UNIDADES			TOTAL
16.0			MURO ALVENARIA					
16.3.6	ORSE	4301	ALAMBRADO (HT=2,00M) COM TELA GALV. 2"X2" (H=1,50M), MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" A CADA 2M, TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" (HORIZONTALS), MURETA (H=0,50M) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO REVESTIDA E PINTADA EM PVA LÁTEX 2 DEMÃOS	M	COMPRIMENTO			
			ALAMBRADO EM TODA A FACE DO TERRENO			24,00		24,00
			TOTAL					24,00
16.3.5	ORSE	10891	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	M2	COMPRIMENTO	LARGURA		
			NOVO PORTÃO PARA AMPLIAÇÃO DO ALAMBRADO		1,80	2,10		3,78
			TOTAL					3,78
-17,0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
17.11	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_06/2018	M2	ÁREA			
			FACHADA FRENTE - LATERAL DIREITA			42,50		42,50
			FACHADA FRENTE - ESTACIONAMENTO			10,75		10,75
			CORREDOR LATERAL			15,00		15,00
			QUADRADO AO LADO DA RAMPA			7,05		7,05
			TOTAL					75,30
17.16	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	ÁREA			
			PAVIMENTO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO			67,25		67,25
			TOTAL					67,25
17.16	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	COMPRIMENTO			
			PAVIMENTO DO ESTACIONAMENTO E ACESSO			29,40		29,40
			TOTAL					29,40
17.18	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	QUANT.			
			PAISAGISMO CONFORME PROJETO DE AGENCIAMENTO			20,00		20,00
			TOTAL					20,00
17.19	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	QUANT.			

Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080





Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Américo de Miranda Júnior
 Sócio Diretor Técnico e Administrador
 E-REGISTRADO CREA - CREA 33.277/01PE

			PAISAGISMO CONFORME PROJETO DE AGENCIAMENTO		4,00			4,00
			TOTAL					4,00
17.20	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	QUANT.			
			RAMPA		2,50			2,50
			TOTAL					2,50


 Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080


 Rio Branco Construtora Eireli - EPP
 Luiz Américo de Miranda Júnior
 Sócio Diretor - Técnico e Administrativo
 Inscrição Profissional - CREA 53.277 0/202

Obra: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do centro de referência especializado de assistência social - CREAS.

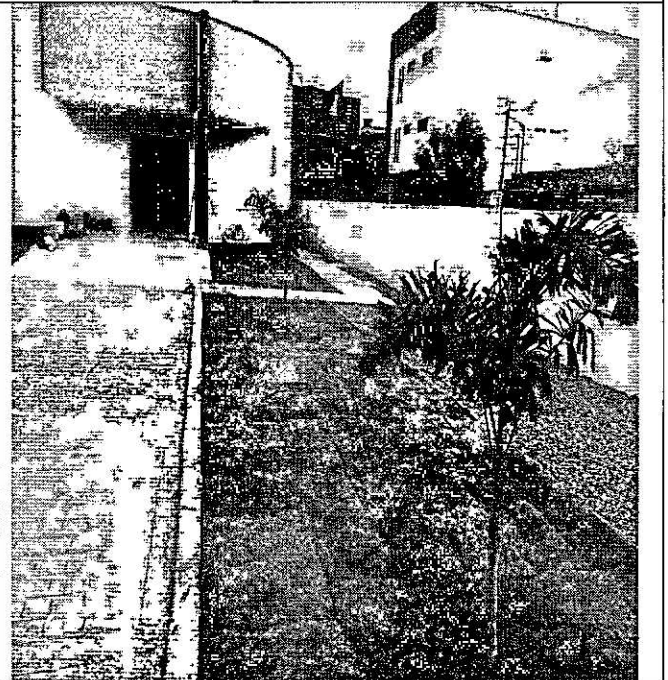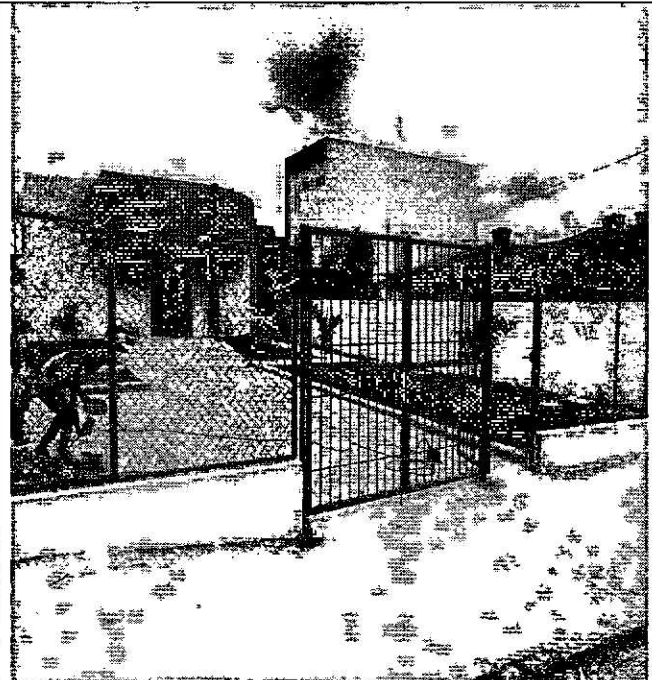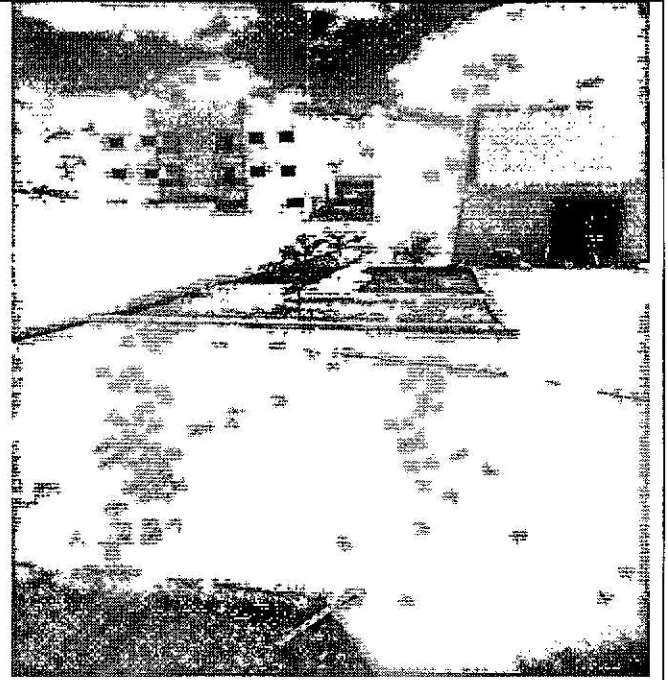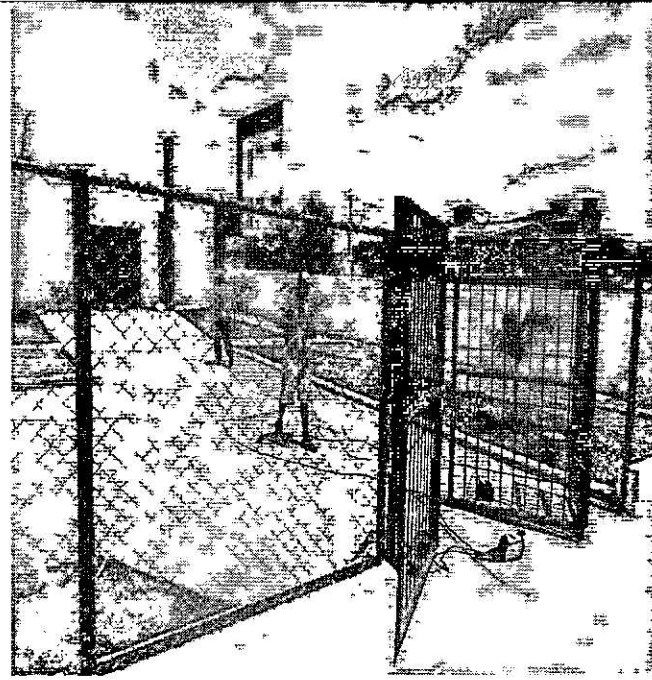


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.951.249/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1999
NOME EMPRESARIAL RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R MINISTRO NELSON HUNGRIA	NÚMERO 63	COMPLEMENTO SALA 402
CEP 51.020-100	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PE
TELEFONE (81) 3222-7482		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/10/2022 às 10:09:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.951.249/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1999
NOME EMPRESARIAL RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R MINISTRO NELSON HUNGRIA	NÚMERO 63	COMPLEMENTO SALA 402
CEP 51.020-100	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE
		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3222-7482	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/10/2022 às 10:09:19 (data e hora de Brasília).


Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.951.249/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/01/1999
NOME EMPRESARIAL RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári				
LOGRADOURO R MINISTRO NELSON HUNGRIA		NÚMERO 63	COMPLEMENTO SALA 402	
CEP 51.020-100	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 3222-7482		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/10/2022 às 10:09:19 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 02.951.249/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:58 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.

Código de controle da certidão: **9130.0DC9.8BB0.2A36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000006187642-90

Data de Emissão: 26/09/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 02.951.249/0001-08

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **24/12/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

2. CMC

406.616-2

3. Endereço

RUA MIN NELSON HUNGRIA, 63 SALA 0402 EDF NELSON HUNGRIA CENTER
BAIRRO BOA VIAGEM, CEP 51020-100, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

02.951.249/0001-08

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8130-30-0 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6810-20-1 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
4221-90-1 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221-90-5 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4223-50-0 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291-00-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292-80-1 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312-60-0 PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4322-30-3 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-10-1 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329-10-3 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-10-4 MONTAG E INST DE SIST E EQUIP DE ILUM E SINALIZ EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399-10-2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-10-5 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7732-20-2 ALUGUEL DE ANDAIMES
6822-60-0 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos

municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 6.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

318.9139.7400

10. Expedido em

Recife, 20 de OUTUBRO de 2022

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

17 de OUTUBRO de 2022

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.951.249/0001-08
Razão Social: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
Endereço: R MINISTRO NELSON HUNGRIA 63 SL 402 / BOA VIAGEM / RECIFE / PE / 51020-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101104312981965119

Informação obtida em 20/10/2022 14:55:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.951.249/0001-08

Certidão n°: 23969289/2022

Expedição: 28/07/2022, às 14:51:34

Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.951.249/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/11/2022

Nº Controle: 051.455.814.572.156.053 | Autenticação Bancária: 062.092.526

Conta de débito: Agência: 2518 | Conta: 22192-9 | Tipo: Conta-Corrente
rio branco construtora ltda | CNPJ: 002.951.249/0001-08

Empresa:

Código de barras: 85890000030-1 00110180221-6 10767020080-1 29512490001-0 Empresa / Órgão:
FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 802951249 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180
Competência: 10/2022 Data de validade: 07/11/2022 Data de débito: 07/11/2022
Valor do pagamento: R\$ 3.000,11

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente rio branco construtora ltda, junto à Agência 2518, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

AC7HoQQP qoKwqVXd SFAGYLpa zJ9HDbU? xvg5wu#q M*eav2XZ AGH3gWuj VyY0H9q2
GWOKIpt7 YxqmEctn cUZKybkY mEx6wzOy 4eoIzduV vZoMgR62 hWvQ5REY F4YemlC@
7WH*BzgP cIU@Og@R gnD35Hu2 fTUzJ3tm ZrQKYbM3 vQsULqDw 00500722 00.00000

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comprovante de Transação Bancária
FGTS
 Data de geração: 07/10/2022
 Nº Controlador: 000.951.249/0001/08 Autenticação Bancária: 040.102.157

Conta de débito: Agência: 2518 | Conta: 22192-9 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: no branco construtora itda | CNPJ: 000.951.249/0001/08

Código de barras: 8580000025-7 77870180221-0 00768920080-5 29512490001-9
 Empresa / Orgão: FGTS/GRF C/TOMADOR
 IDENTIF. EMPRESA: 802951249
 CNPJ/CEI:
 Cod. convênio: 0180
 Competência: 09/2022
 Data de validade: 07/10/2022
 Data de débito: 06/10/2022
 Valor do pagamento: R\$ 2.677,87

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente no branco construtora itda, junto à Agência 2518, de data de pagamento.
 Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Orgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

80089571 002951249 0000000025-7 77870180221-0 00768920080-5 29512490001-9
 11Aq28bl 178c1lyf 8UznoDEj 2Q5sqn2 75576UP1 VTRV37Jq TrQ8Tavk raUS*1e2
 KPF17Z24 0089VLEp 8uzCkZRA UCSTWERN 05:645m0 8qgu1g6e 00502622 00.7006:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | 16 Bradesco 0800 724 9383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvitoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

TELEFONE
 (081) 3222 7482

QUOTA FGTS
 8

DATA DE VALIDADE
 07/10/2022

87

MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/10/2022 17:00:26

GTPP SERPIP 8.40

EMPRESA / SOCIEDADE		02-000/TELEFONE	
NO BRANCO CONSTRUTORA BIRELI EPP		(0081) 3222 7482	
04-SÍMBOLOS	05-REMUNERAÇÃO	06-QUOTE TRABALHADORAS	07-ALÍQUOTA FGTS
1	33.473,44	23	8
09-10 RECOLHIMENTO	16-INSCRIÇÃO/EMP(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
0.8080-	02.951.249/0001 08	09/2022	07/10/2022
13-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER	
2.677,87		0,00	
		2.677,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

000000026 0000000000 007689200805 295124900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

