

OBJETO: CONTRUÇÃO DA SEDE DO IPSEG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE		ORDEM DE SERVIÇO:	21/10/2024	Resumo Financeiro		
CONTRATO N 156/2024		PRAZO DE EXECUÇÃO:	270 DIAS	VALOR DO CONTRATO		
LOCAL: GRAVATÁ - PE		TRANSCORRIDO:	148 dias	APOSTILAMENTO - REAJUSTE		
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI		PARALISAÇÃO:		VALOR ADITIVO		
DATA DE ELABORAÇÃO:		REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO		11,94%
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2025 A 18/03/2025		ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		87,44%
		PRAZO RESTANTE:	32 dias	SALDO DO CONTRATO		12,56%
				Valor (R\$)		%
				R\$ 617.863,33		

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06										
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
Item sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acum inclui o período	
15	APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS									
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 631,90	R\$ 1.263,80		2,00	R\$ -	R\$ -	
15.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇAS BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 264,29	R\$ 1.057,16		4,00	R\$ -	R\$ 1.057,16	
15.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	R\$ 31,03	R\$ 186,18		6,00	R\$ -	R\$ 186,18	
15.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	R\$ 331,25	R\$ 2.650,00		8,00	R\$ -	R\$ 2.650,00	
15.5	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00	R\$ 135,25	R\$ 811,50		6,00	R\$ -	R\$ 811,50	
15.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	2,08	R\$ 484,77	R\$ 1.008,32		2,08	R\$ -	R\$ 1.008,32	
15.7	LAVATÓRIO/ CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA COLORIDA, COM LADRÃO. DIMENSÕES *52 X 45* CM (L X C)	UN	5,00	R\$ 383,50	R\$ 1.917,50			R\$ -	R\$ -	
15.8	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 197,45	R\$ 789,80		4,00	R\$ -	R\$ 789,80	
15.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 114,06	R\$ 456,24		4,00	R\$ -	R\$ 456,24	
15.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 102,24	R\$ 102,24		1,00	R\$ -	R\$ 102,24	
15.11	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF. 1135 C39, DECA OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 73,14	R\$ 146,28		2,00	R\$ -	R\$ 146,28	
16	GISTEIRA									
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO MOLE (ARGILA ORGANICA SATURADA) PROFUNDIDADE ATÉ 4,50M	M3	28,00	R\$ 104,89	R\$ 2.936,92		28,00	R\$ -	R\$ 2.936,92	
16.2	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10CM, FCK = 30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF. 09/2021	M2	10,50	R\$ 146,07	R\$ 1.533,74		10,50	R\$ -	R\$ 1.533,74	
16.3	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZADO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	17,60	R\$ 14,38	R\$ 253,09		17,60	R\$ -	R\$ 253,09	
16.4	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	48,86	R\$ 12,96	R\$ 633,23		48,86	R\$ -	R\$ 633,23	
16.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) FBK = 4,5 MPA UTILIZANDO PALHETA. AF. 10/2022	M2	19,50	R\$ 103,14	R\$ 2.011,23		19,50	R\$ -	R\$ 2.011,23	
16.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	19,50	R\$ 7,26	R\$ 141,57		19,50	R\$ -	R\$ 141,57	
16.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	19,50	R\$ 41,98	R\$ 818,61		19,50	R\$ -	R\$ 818,61	
16.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS, AF. 09/2023	M2	30,00	R\$ 35,03	R\$ 1.050,90		30,00	R\$ -	R\$ 1.050,90	
16.9	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020 PA	M2	10,50	R\$ 181,75	R\$ 1.908,38		10,50	R\$ -	R\$ 1.908,38	
16.10	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 1.119,50	R\$ 1.119,50		1,00	R\$ -	R\$ 1.119,50	
16.11	CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCAVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECAQUE 5 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$ 1.310,02	R\$ 1.310,02		1,00	R\$ -	R\$ 1.310,02	
17	PLATAFORMA ELEVATÓRIA									
17.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UNI140/1 ENTRADA) ADJACENTE (ADJ140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO FECHAMENTO ALUMINIO COMP. (ACM) 02 PARADAS PER. 3M CX CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 37.337,64	R\$ 37.337,64			R\$ -	R\$ -	
TOTAL GERAL: IMPORTA-SE O VALOR DO BM EM R\$ 73.742,31 (SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)									R\$ 73.742,31	

CONSTRUTORA IPOBIL LTDA
22.931.084/0001-10

Engenheiro Civil
CREA 1821584147

Cantos Alberto de Farias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONTRUÇÃO DA SEDE DO IPSEG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE		ORDEM DE SERVIÇO:	21/10/2024	Resumo Financeiro	
CONTRATO Nº 156/2024		PRAZO DE EXECUÇÃO:	270 DIAS	VALOR DO CONTRATO	R\$ 617.863,33
LOCAL: GRAVATÁ/PE		TRANSCORRIDO:	148 dias	VALOR REVISADO	R\$ -
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI		PARALISAÇÃO:	0	APOSTILAMENTO - REALISTE	R\$ -
DATA DE ELABORAÇÃO:		ADITIVO DE PRAZO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 73.742,31
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2025 A 18/03/2025		PRAZO RESTANTE:	32 dias	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R\$ 540.266,83
				SALDO DO CONTRATO	R\$ 77.596,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	UNIDADE	C	L	H	QTD	MEDIDO
6.0	REVESTIMENTO							
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	121,50	M2	9,00	8,88			79,92
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	326,25	M2	8,40	20,97			176,15
6.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM ESPESSURA 6CM. AF. 10/2022	35,70	M2					
	FRENTE DA SEDE			10,20	3,50			35,70
	LATERAL ESQUERDA			1,43	10,38		ADITIVO	14,84
8.0	ESQUADRIAS							
8.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	10,00	UN					10,00
8.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	7,00	UN					7,00
							ADITIVO	1,00
8.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	11,16	M2	11,16				11,16
8.4	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	5,04	M2	5,04				5,04
8.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0-90X2.10)m E=10MM	1,00	CJ					1,00
8.6	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM FIXADO COM SPIDER GLASS	6,00	M2	6,00				6,00

Carlos Alberto de Farias
Engenheiro Civil
CREA 1821984147

CONSTRUTORA IPOGIL LTDA
22.931.084/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONTRUÇÃO DA SEDE DO IPSEG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE				ORDEM DE SERVIÇO:		21/10/2024		Resumo Financeiro	
CONTRATO Nº 156/2024				PRazo DE EXECUÇÃO:		270 DIAS		VALOR DO CONTRATO	R\$ 617.863,33
LOCAL: GRAVATÁ/PE				TRANSCORRIDO:		148 dias		VALOR REVISADO	R\$ -
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI				PARALISAÇÃO:		0		APOSTILAMENTO - REAJUSTE	R\$ -
DATA DE ELABORAÇÃO:				ADITIVO DE PRAZO:		18/03/2025		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 73.742,31
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2025 A 18/03/2025				PRAZO RESTANTE:		32 dias		VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R\$ 540.266,83
				PRAZO RESTANTE:		32 dias		SALDO DO CONTRATO	R\$ 77.596,50
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06									
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
11.3	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	1,00		UN					1,00
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS								
12.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60X0.60X0.60	3,00		UM					3,00
15	APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS								
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	2,00		UN					2,00
15.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇAS BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	4,00		UN					4,00
15.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	6,00		UN					6,00
15.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	8,00		UN					8,00
15.5	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	6,00		UN					6,00
15.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	2,08		M2					2,08
	WC SUPERIOR 01					0,50	0,72		0,36
	WC SUPERIOR 02					0,40	0,62		0,25
	COPA SUPERIOR ESPELHO					0,10	1,90		0,19
	COPA SUPERIOR					0,60	1,90		1,14
	WC TERREO 01					0,72	0,40		0,29

Carlos Alberto de Farias
Engenheiro Civil
CREA 1821584147

CONSTRUTORA IPOGIL LTDA
22.931.084/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO



OBJETO: CONTRUÇÃO DA SEDE DO IPSEG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE			ORDEM DE SERVIÇO:	21/10/2024	Resumo Financeiro	
CONTRATO Nº 156/2024			PRAZO DE EXECUÇÃO:	270 DIAS	VALOR DO CONTRATO	R\$ 617.863,33
LOCAL: GRAVATÁ/PE			TRANSCORRIDO:	148 dias	VALOR REVISADO	R\$ -
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI			PARALISAÇÃO:	0	APOSTILAMENTO - REAJUSTE	R\$ -
DATA DE ELABORAÇÃO:			ADITIVO DE PRAZO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$ 73.742,31
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2025 A 18/03/2025			PRAZO RESTANTE:	32 dias	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R\$ 540.266,83
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 06						
	ESPELHO WC TÉRREO			0,10	0,29	0,03
	WC TÉRREO 02			0,40	0,72	0,29
	ESPELHO WC TÉRREO			0,10	0,29	0,03
	WC TÉRREO 03			0,62	0,40	0,25
	ESPELHO WC TÉRREO			0,10	0,25	0,03
	WC ACESSÍVEL TÉRREO			0,50	0,72	0,36
	ESPELHO WC ACESSÍVEL			0,10	0,36	0,04
	BALCÃO RECEPÇÃO			1,42	2,78	3,95
	BALCÃO COZINHA			0,60	1,60	0,96
	ESPELHO BALCÃO COZINHA			0,10	1,60	0,16
						8,33
						2,08
						6,25
15.7	LAVATORIO/ CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA COLORIDA, COM LADRÃO, DIMENSÕES *52 X 45* CM (L X C)	5,00	UN			5,00
15.8	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR	4,00	UN			4,00
						3,00
15.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	4,00	UN			4,00
15.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	1,00	UN			1,00
15.11	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR	2,00	UN			2,00
16	CISTERNA					
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO MOLE (ARGILA ORGANICA SATURADA) PROFUNDIDADE ATÉ 4,50M	28,00	M3			28,00
16.2	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10CM, FCK = 30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	10,50	M2			10,50

Carlos Alberto de Farias
Engenheiro Civil
CREA 18071584147

CONSTRUTORA IPOGIL LTDA
22.931.084/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

[illegible]

Carlos Alberto de Farias
Engenheiro Civil
CREA 1872584147

CONSTRUTORA IPOGIL LTDA
22.931.084/0001-10



Foto 1

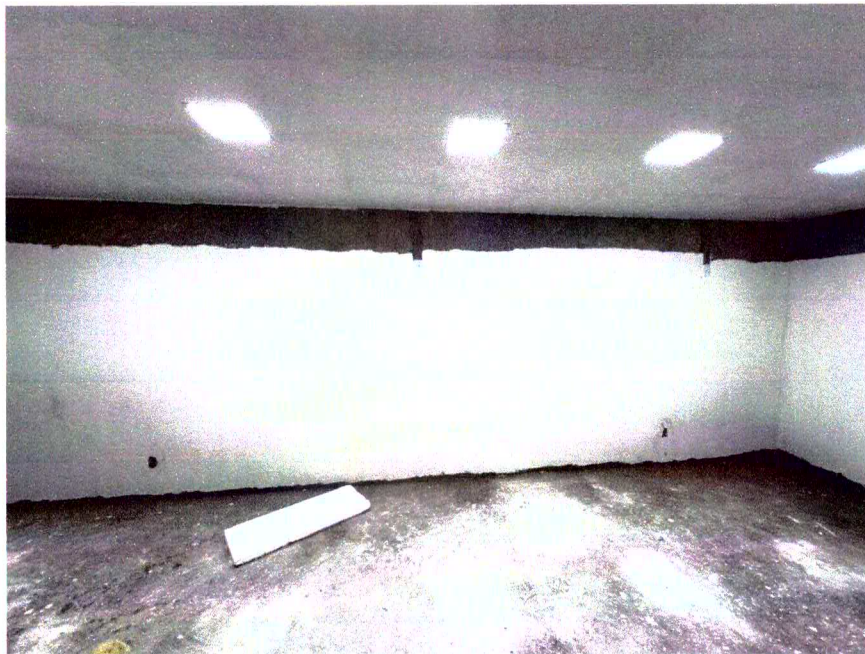


Foto 2





Foto 3



Foto 4



FOTO 4

